


13. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre Fond na spravodlivú transformáciu

3.3.2026

ÚZ Hotel Bôrik

Prezentácia

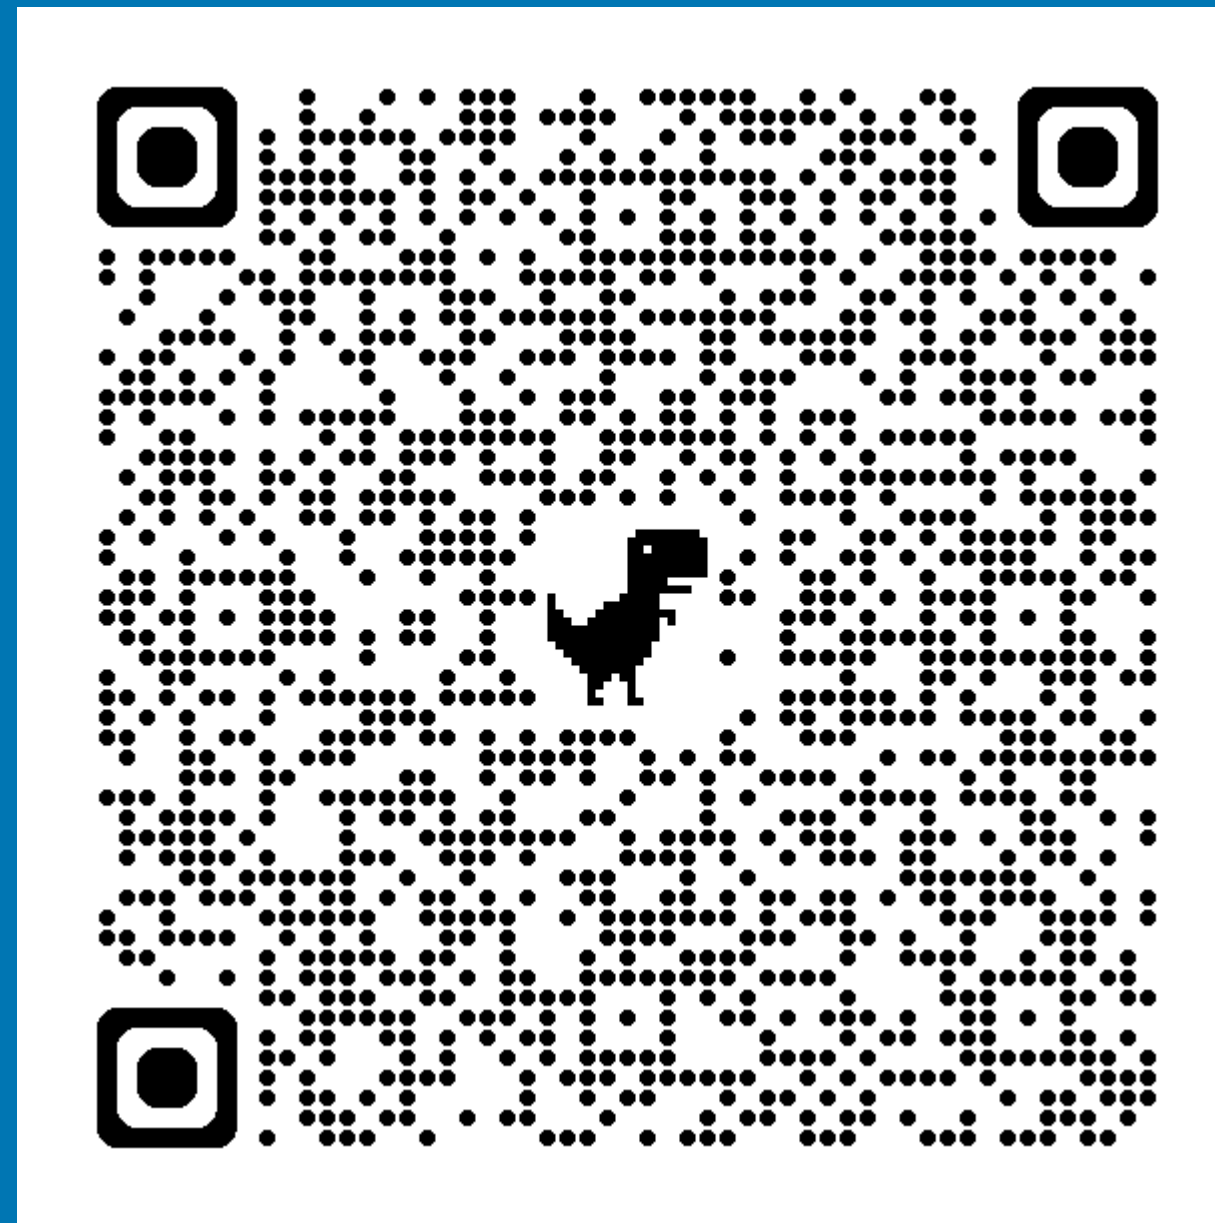

PROGRAM ZASADNUTIA

| | |
|----|--|
| 1. | <p>Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko a Fondu na spravodlivú transformáciu vrátane informácie o odhadoch čerpania na nasledujúce obdobie - <i>informuje RO a SO</i>• Informácie k 3. zmene Programu Slovensko a k novej priorite 8P2 v rámci Modernizovanej politiky súdržnosti (cenovo dostupné bývanie) – <i>informuje RO a Slovak Investment Holding</i>• Informácie k zmenám v priorite 8P1 mimo Modernizovanej politiky súdržnosti – <i>informuje RO</i> <p>Diskusia</p> |
| 2. | <p>Návrh na presun alokácie v rámci priority 8P1. Fond na spravodlivú transformáciu Programu Slovensko z opatrenia 8.2.1 Podpora čistej energie do opatrenia 8.2.2 Revitalizácia a rekonverzia priemyselných území</p> <p>Prerokovanie a hlasovanie (Predkladateľ: MIRRI SR)</p> |
| 3. | <p>Rôzne</p> <ul style="list-style-type: none">• Informácia o aktuálnom stave III. piliera Mechanizmu spravodlivej transformácie (Public Sector Loan Facility) - <i>informuje EK (DG REGIO)</i>• Informácia o REGIOSTARS - <i>informuje EK</i> |
| 4. | <p>Záver</p> |

1. Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa

Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko a FST *- informuje RO a SO*

Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko *- informuje RO*

Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko

(k 20.02.2026)



Výzvy

351 vyhlásených
výziev

11,13 mld. €

88,3 % z alokácie



Kontrahovanie

3 211 zazmluvnených
projektov

7,57 mld. €

60,1 % z alokácie



Čerpanie

Čerpanie na národnej
úrovni

1,82 mld. €

14,4 % z alokácie


Implementácia Programu Slovensko

(k 20.02.2026)

| Cieľ politiky alebo TP | Ciele Programu Slovensko | Alokácia EÚ zdroj | Výzvy | | | Kontrahovanie | | | Čerpanie | |
|---------------------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | Počet výziev | EÚ zdroj | % z alokácie | Počet projektov | EÚ zdroj | % z alokácie | EÚ zdroj | % z alokácie |
| 1 | Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko | 1 631 243 498 | 63 | 1 190 219 394 | 73,0% | 204 | 723 838 230 | 44,4% | 78 564 122 | 4,8% |
| 2 | Zelenšie Slovensko | 4 024 574 855 | 72 | 3 751 246 513 | 93,2% | 1 230 | 2 342 803 125 | 58,2% | 602 804 788 | 15,0% |
| 3 | Prepojenejšie Slovensko | 2 543 893 375 | 25 | 2 151 304 982 | 84,6% | 252 | 1 660 451 094 | 65,3% | 238 336 816 | 9,4% |
| 4 | Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko | 3 115 328 401 | 116 | 3 007 182 273 | 96,5% | 1 269 | 2 249 869 133 | 72,2% | 769 846 431 | 24,7% |
| 5 | Európa bližšie k občanom | 427 803 261 | 6 | 354 923 304 | 83,0% | 135 | 125 069 521 | 29,2% | 8 836 551 | 2,1% |
| FST | Fond spravodlivej transformácie | 440 658 242 | 17 | 380 358 809 | 86,3% | 52 | 254 040 444 | 57,7% | 25 516 877 | 5,8% |
| TP | Technická pomoc | 410 233 301 | 57 | 291 087 296 | 71,0% | 74 | 214 508 209 | 52,3% | 93 082 998 | 22,7% |
| CELKOM PROGRAM SLOVENSKO | | 12 593 734 933 | 351 | 11 126 322 571 | 88,3% | 3 211 | 7 570 579 757 | 60,1% | 1 816 988 582 | 14,4% |

Implementácia Programu Slovensko podľa cieľov politiky

(k 20.02.2026)

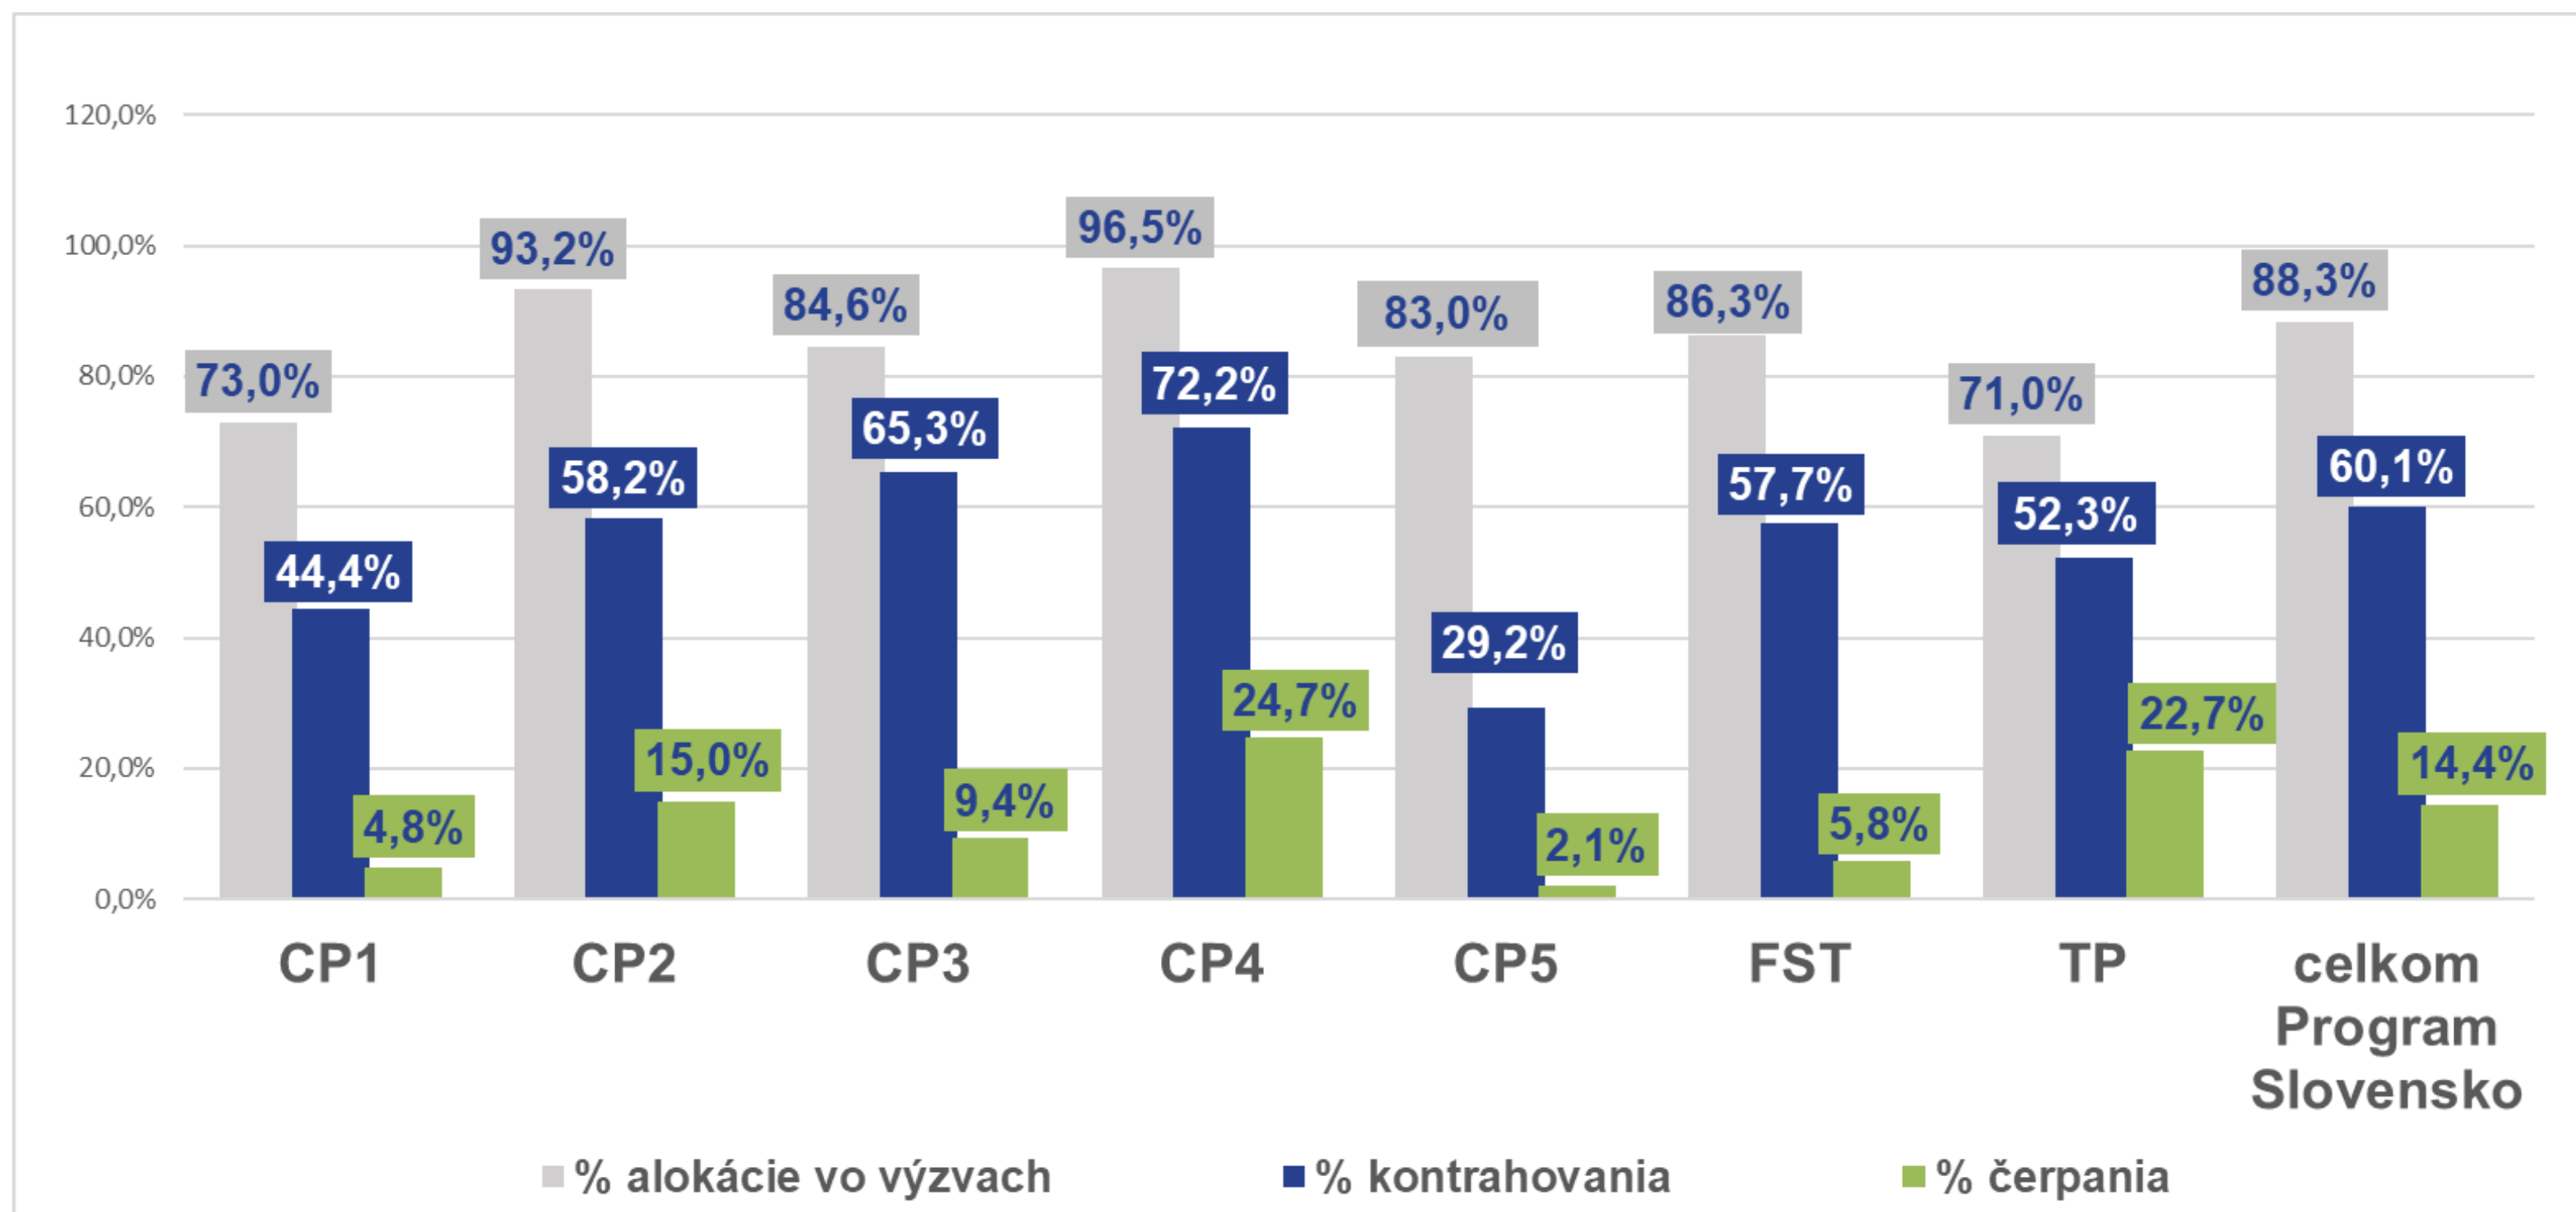

Implementácia FST podľa rezortov

(k 20.02.2026 a vyznačenou zmenou od posledného zasadnutia Komisie pre FST)

| Rezort | Alokácia EÚ zdroj | Výzvy | | | | Prijaté ŽoNFP | | Schválené ŽoNFP | | Kontrahovanie | | | | Čerpanie | | |
|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Počet výziev | EÚ zdroj | % z alokácie EÚ zdroj | Zmena od 19.9.25 (p.b.) | Počet ŽoNFP | Žiadaný NFP | Počet ŽoNFP | Schválený NFP | Počet projektov | EÚ zdroj | % z alokácie EÚ zdroj | Zmena od 19.9.25 (p.b.) | EÚ zdroj | % z alokácie EÚ zdroj | Zmena od 19.9.25 (p.b.) |
| MIRRI SR | 226 693 618 | 7 | 168 706 024 | 74,4% | -17,3% | 94 | 265 233 339 | 45 | 182 291 197 | 30 | 116 992 180 | 51,6% | 1,7% | 1 689 056 | 0,7% | 0,7% |
| MH SR | 131 541 420 | 4 | 129 246 420 | 98,3% | 15,9% | 38 | 140 518 545 | 13 | 118 522 027 | 10 | 76 826 341 | 58,4% | 16,6% | 11 974 679 | 9,1% | 0,0% |
| SIEA | 52 884 894 | 3 | 52 884 894 | 100,0% | 68,2% | 20 | 59 468 352 | 11 | 38 236 268 | 9 | 31 778 615 | 60,1% | 48,8% | 385 911 | 0,7% | 0,7% |
| MPSVR SR | 29 538 310 | 3 | 29 521 471 | 99,9% | 0,0% | 3 | 32 520 481 | 3 | 32 520 481 | 3 | 28 443 308 | 96,3% | 41,5% | 11 467 231 | 38,8% | 0,5% |
| CELKOM FST | 440 658 242 | 17 | 380 358 809 | 86,3% | 4,1% | 155 | 497 740 717 | 72 | 371 569 973 | 52 | 254 040 444 | 57,7% | 14,5% | 25 516 877 | 5,8% | 0,5% |

Poznámka: Alokácia za EU zdroj FST sa uvádza bez technickej pomoci

Informácie o odhadoch čerpania FST na nasledujúce obdobie *- informuje RO*

Informácie o odhadoch čerpania FST na nasledujúce obdobie (do 30.9.2026)

- Odhad vychádza z podkladu od jednotlivých gestorov k 01. 02. 2026 (aktualizovaný každý mesiac)
- Odhad je spracovaný na mesiace február až september 2026
- Riziková suma je voči prostriedkom alokovaným na FST, čl. 4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056, ktoré je potrebné deklarováť na EK najneskôr do 30.10.2026

| REZORT / Gestor | Celkový odhad za EÚ zdroj obdobie 02 až 09 2026 | Riziková suma v rámci odhadu EÚ zdroj |
|-----------------|--|--|
| MPSVR SR | 5 289 201 | 1 020 000 |
| MIRRI SR | 65 571 460 | 34 118 801 |
| MH SR | 33 237 637 | 23 454 163 |
| SIEA | 10 676 916 | 1 210 291 |
| MŽP SR* | - | - |
| MIRRI – TA FST | 2 200 000 | 0 |
| SPOLU | 116 975 213 | 59 803 254 |

* alokácia MŽP SR sa plánuje v rámci revíe P SK presunúť do SIEA

Informácie o odhadoch čerpania FST na nasledujúce obdobie (09/2026)

Odhad po mesiacoch

| Rezort / gestor | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| MPSVR SR | 285 690 | 130 482 | 628 463 | 609 283 | 609 283 | 2 006 000 | 510 000 | 510 000 |
| MIRRI SR | 3 583 598 | 8 719 908 | 5 072 112 | 9 602 145 | 13 441 548 | 2 978 447 | 9 558 833 | 12 614 870 |
| MH SR | 54 420 | 1 628 270 | 50 784 | 0 | 8 050 000 | 884 720 | 0 | 22 569 443 |
| SIEA | 217 500 | 120 695 | 7 700 000 | 50 000 | 1 378 430 | 350 000 | 388 060 | 472 231 |
| TA - FST | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| SPOLU | 4 141 208 | 10 599 355 | 13 451 359 | 10 261 428 | 24 029 260 | 6 769 167 | 11 006 893 | 36 716 544 |

Faktory zvyšujúce riziko decommitmentu FST (k 30. 9. 2026)

- významná časť plánovaného čerpania je koncentrovaná do mesiacov **júl – september 2026**
- každé procesné zdržanie (VO, kontrola, realizácia) sa premieta priamo do rizika
- infraštruktúrne projekty sú závislé od úspešného a bezproblémového verejného obstarávania
- tranže FN podmienené reálnym dopytom a pokrokom portfólia
- časť čerpania plánovaná na projektoch, ktoré:
 - ešte nie sú zazmluvnené,
 - resp. sú v počiatočnej fáze implementácie

Aktuálny stav implementácie FST - *informujú SO*

MIRRI SR

Aktuálny stav implementácie FST – vyhlásené výzvy

| | Názov výzvy | Opatrenie | Alokácia výzvy | Počet predložených /schválených žiadostí | Žiadaná/zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Čerpanie |
|----|--|-----------|----------------|--|-------------------------------------|----------------|
| 1. | Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania | 8.3.1 | 54 638 354 € | 35/25 | 60 835 228,85 € / 46 002 666,27€ | 1 417 223,86 € |
| 2. | Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie | 8.2.1 | 30 814 298 € | 18/8 | 43 601 487,30 € / 1 500 857,98 € | - |
| 3. | Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami | 8.2.3 | 37 492 582 € | 8/6 | 52 125 744,62 € / 13 303 422,85 € | - |
| 4. | Podpora a rozvoj výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom partnerov s potenciálom transferu aplikačnej praxe | 8.1.2 | 13 163 180 € | 29/0 | 25 368 680,73€ / - | - |
| 5. | Obnova a zmena využitia hnedých priemyselných areálov (brownfieldov) | 8.2.2 | 5 000 000 € | 3/1 | 9 093 458,98€ / - | - |
| 6. | Podpora vyhľadávania, prieskumu a overovania zdrojov geotermálnej energie pre energetické využitie | 8.2.1 | 10 571 085 € | 4/0 | 5 048 046,70 € / - | - |

Informácia o pripravovaných výzvach z FST

| | Názov výzvy | Žiadateľ | Opatrenie | Typ projektu | Predpokladaný termín vyhlásenia | Alokácia (zdroj EÚ) |
|----|---|--|-----------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 1. | Podpora coworkingových centier a podnikateľských inkubátorov | Súkromný, verejný a neziskový sektor | 8.1.1 | DP | 1Q/2026 | 3 727 400 € |
| 2. | Zostaň a zmeň – mládež pre spravodlivú transformáciu | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 8.3.2 | NP | 1Q/2026 | 2 500 000 € |
| 3. | Podpora spolupráce medzi MSP a strednými odbornými školami za účelom zlepšenia vzdelávania, odbornej prípravy a zručností | Súkromný sektor | 8.3.1 | DP | 1Q/2026 | 7 697 271 € |
| 4. | Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie v Banskobystrickom kraji | Súkromný sektor | 8.2.1 | DP | 1Q/2026 | 4 335 824 € |
| 5. | Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami II. | Súkromný a verejný sektor | 8.2.3 | DP | 1Q/2026 | 17 587 251 € |
| 6. | Finančné nástroje na podporu dostupného bývania | Slovak Investment Holding | - | FN | 3Q/2026 | 5 500 000 € |

*oprávnení žiadatelia budú zdefinovaní na úrovni výzvy v rámci podmienky poskytnutia príspevku

Informácia o zmenách harmonogramu vyhlásených/pripravovaných výziev

| | Názov výzvy / zameranie výzvy | Druh zmeny* | Zdôvodnenie zmeny | Alokácia (EÚ zdroj) |
|----|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Podpora coworkingových centier a podnikateľských inkubátorov / podpora aktivít na vytvorenie nových, alebo obnovu, rozšírenie kapacity podnikateľských inkubátorov, coworkingových centier a hubov | posunutie termínu vyhlásenia výzvy | Presun výzvy z 4Q/2025 na 1Q/2026 z dôvodu interného schvaľovania. | 3 727 400 € |
| 2. | Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie v Banskobystrickom kraji / investície do zariadení na výrobu elektriny z OZE | posunutie termínu vyhlásenia výzvy | Presun výzvy z 4Q/2025 na 1Q/2026 z dôvodu zmien v nastavení výzvy. | 4 335 824 € |
| 3. | Zostaň a zmeň – mládež pre spravodlivú transformáciu/podpora aktivít na realizáciu mládežníckych projektov, komunikačných aktivít a aktivít budovania kapacít | posunutie termínu vyhlásenia výzvy | Presun výzvy z 4Q/2025 na 1Q/2026 z dôvodu interného schvaľovania. | 2 500 000 € |
| 4. | Podpora spolupráce medzi MSP a strednými odbornými školami za účelom zlepšenia vzdelávania, odbornej prípravy a zručností/investície do MSP na obstaranie technológií za účelom spolupráce so SOŠ – zlepšenie odbornej prípravy študentov | posunutie termínu vyhlásenia výzvy | Presun výzvy z 4Q/2025 na 1Q/2026 z dôvodu interného schvaľovania. | 7 697 271 € |

* napr. posunutie termínu vyhlásenia/uzavretia výzvy; neuskutočnená participácia, ak bola v harmonograme indikovaná; **zmena alokácie/zrušenie výzvy v dôsledku presunu finančnej alokácie do priorít MPS**

Informácia o stave schválených národných projektov v FST

| | Názov zámeru | Opatrenie | Prijímateľ | Partner | Suma (zdroj EÚ) | Aktuálny stav/ čerpanie |
|----|--|-----------|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. | Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline | 8.2.1 | MH Teplárenský holding, a.s. | GEOTERM KOŠICE, a.s. | 56 185 233 € | 278 386,07 € |

Aktuálny stav:

MH TH - aktivita prijímateľa

- opakované verejné obstarávanie v príprave, prijímateľ pripravuje podklady pre zmenu projektu.

GEOTERM – aktivita partnera (vrty)

- 25.12.2025 – ukončená realizácia prvého vrtu (GTD-4) s celkovou hĺbkou 3597 metrov;
- 15.01.2026 – začiatok vrtných prác druhého vrtu (GTD-5);
- na prelome 02/2026-03/2026 sa predpokladá predloženie žiadosti o platbu vo výške približne 7 200 000 EUR, ktorá bude súvisieť s realizáciou prvého vrtu.

MH SR

Aktuálny stav implementácie FST – vyhlásené výzvy

| | Názov výzvy | Opatrenie | Alokácia výzvy | Počet predložených /schválených žiadostí | Žiadaná/zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Čerpanie |
|----|--|-----------|----------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 1. | Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc* | 8.1.3 | 56 964 953 € | 5 / 2 | 56 964 926 € / 17 508 843 € | 0 € |
| 2. | Výzva na predloženie Národného projektu „Štátny park Handlová“ | 8.2.2 | 15 038 285 € | 1 / 1 | 15 038 285 € / 15 038 285 € | 0 € |
| 3. | Výzva zameraná na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja z FST | 8.1.2 | 17 327 582 € | 31 / 7 | 20 194 102€ / 4 363 613 € | 0 € |
| 4. | Finančné nástroje – FST: Záručný nástroj kombinovaný s grantovou zložkou | 8.1.1 | 39 915 600 € | 1 / 1 | 39 915 600 € / 39 915 600 € | 11 974 680 € |

*podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci

Doplňujúce informácie:

1. Alokácia výzvy: 24. 9. 2025 navýšenie alokácie výzvy o **20 951 953 €**, t.j. z 36 013 000 € na **56 964 953 €** (47 699 527 € pre **TSK** / 9 265 426 € pre **KSK**)
 Stav predložených ŽoNFP: **2 ŽoNFP** zazmluvnené (17 508 843 €), **2 ŽoNFP** schválené (32 699 501 €), **1 ŽoNFP** v procese schvaľovania (6 756 582€).

3. Alokácia výzvy: 9 997 703 € pre **TSK** / 3 000 000 € pre **BBSK** / 4 329 879 € pre **KSK**)
 Min. a max. výška NFP: 100 000 € – 800 000 €
 Stav predložených ŽoNFP: **31 ŽoNFP** k 25.2.2026, z toho **6 ŽoNFP** zazmluvnené (4,36 mil. €), **1 ŽoNFP** schválená (0,78 mil. €), **2 ŽoNFP** neschválené (1,1 mil. €) a **2 ŽoNFP** zastavené konanie (1,43 mil. €)
 Termín uzavretia výzvy 7. hodnotiacim kolom 28.2.2026.

4. Alokácia COV: **46 959 529,42 €** (z toho EÚ zdroj = **39 915 600,00 €**; z toho ŠR zdroj = **7 043 929,42 €**)
 Aktuálny stav: doposiaľ bola prevedená 1. tranža na SIH vo výške 11 974 680 € (30% z alokácie)
Produkty sú dostupné vo všetkých bankách od júna 2025. K 12/2025 bolo v rámci regiónov FST uzavretých **64 zmlúv o úvere** vo výške **9 mil. €**.

Informácia o stave schválených národných projektov v FST

| | Názov zámeru | Opatrenie | Prijímateľ | Partner | Suma (zdroj EÚ) | Aktuálny stav/ čerpanie |
|----|----------------------|-----------|-------------------|---------|-----------------|----------------------------|
| 1. | Štátny park Handlová | 8.2.2 | MH Invest, s.r.o. | n/a | 15 038 285 € | 0 € |

Cieľ NP: transformácia časti územia bane v meste Handlová nazývanej ako „Dolná terasa“ s celkovou výmerou 4,5 ha na priemyselný park

Zmluva o poskytnutí NFP podpísaná **19.6.2025**.

Celková zazmluvnená suma: **17 692 100 €** (EÚ zdroj: 15 038 285 € = 85 %, ŠR zdroj: 1 238 447 € = 7 %, vlastný zdroj prijímateľa: 1 415 368 € = 8 %)

Plán predloženia 1. ŽoP v marci 2026 vo výške 1,5 mil. €.

Aktuálny stav: odkúpené nehnuteľnosti (pozemky a stavby),
vypracovaná projektová dokumentácia pre odstránenie nadzemných stavieb budov a spevnených plôch, výber vykonávateľa búracích prác,
prebieha obstarávanie na výkon prieskumov (geologický, inžinierskogeologický, geofyzikálny, hydrogeologický, radónový, pedologický a dendrologický,
radónový, dopravno-kapacitné posúdenie)

SIEA

Aktuálny stav implementácie FST – vyhlásené výzvy

| | Názov výzvy | Opatrenie | Alokácia výzvy | Počet predložených /schválených žiadostí | Žiadaná/zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Čerpanie |
|----|--|-----------|----------------|---|---|-----------|
| 1. | Výzva na podporu energetickej efektívnosti verejných budov regiónu hornej Nitry | 8.2.1 | 26 384 894 € | <p>Predložené 10 v sume 7 637 170 €</p> <p>Schválené 9 v sume 6 000 827 €</p> | <p>Zmluvne viazané projekty v sume 5 933 396 €</p> | 164 752 € |
| 2. | Finančné nástroje - Zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov, vrátane podpory inteligentných opatrení a inovatívnych riešení | 8.2.1 | 25 500 000 € | x | x | 0 |

Informácia o stave schválených národných projektov v FST

| | Názov zámeru | Opatrenie | Prijímateľ | Partner | Suma (zdroj EÚ) | Aktuálny stav/ čerpanie |
|----|---|-----------|---|---------|-----------------|--|
| 1. | Príprava energetických auditov pre Banskobystrický kraj | 8.2.1 | Slovenská inovačná a energetická agentúra | - | 1 000 000 € | v implementácii poskytnuté zálohové platby 583 950 € schválené žiadosti o platbu 431 138 € |

MPSVR SR

Aktuálny stav implementácie FST – vyhlásené výzvy

| | Názov výzvy | Opatrenie | Alokácia výzvy | Počet predložených /schválených žiadostí | Žiadaná/zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Čerpanie K 20.02.2026 |
|----|---|--|----------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. | - podpora celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie s cieľom rozvoja zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie | 12 248 831 € | 1/1 | 10 502 427 € / 11 170 668 € | 10 055 831 € |
| 2. | Finančné nástroje implementované v rámci priority 8P1 | - podpora podnikania, rozvoj malých a stredných podnikov a tvorba udržateľných pracovných miest | 5 000 000 € | 1/1 | 5 000 000 € / 5 000 000 € | 1 496 000 € |
| 3. | Zručnosti pre trh práce v transformujúcich sa regiónoch | - podpora celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie s cieľom rozvoja zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie | 12 272 640 € | 1/1 | 12 272 640 € / 12 272 640 € | 0 € |

Informácia o stave schválených národných projektov v FST

| | Názov zámeru | Opatrenie | Prijímateľ | Partner | Suma (zdroj EÚ) | Aktuálny stav/ Čerpanie k 20.02.2026 |
|----|---|--|----------------------------------|---|-----------------|---|
| 1. | Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II. PSK-MPSVR-003-2023-NP-FST | - podpora celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie s cieľom rozvoja zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie | Trenčiansky samosprávny kraj | Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v skratke HBP, a.s. Slovenské elektrárne, a.s. | 11 170 668 € | 10 055 831 € |
| 2. | Finančné nástroje implementované v rámci priority 8P1 (MPSVR SR) PSK-MPSVR-002-2024-FN-FST | - podpora podnikania, rozvoj malých a stredných podnikov a tvorba udržateľných pracovných miest | Slovak Investment Holding, a. s. | - | 5 000 000 € | 1 496 000 € |
| 3. | Zručnosti pre trh práce v transformujúcich sa regiónoch PSK-MPSVR-074-2025-NP-FST | - podpora celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie s cieľom rozvoja zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie | UPSVaR SR | - | 12 272 640 € | 0 € |

NP PODPORA ZAMESTNATEĽNOSTI V REGIÓNE HORNÁ NITRA II.

Priorita: 401801 - 8P1 Fond na spravodlivú transformáciu

Opatrenie: 401801J80131 - Podpora vzdelávania, odbornej prípravy, zručností a rekvalifikácie

Špecifický cieľ: 401801J801-JSO8.1 Umožnenie regiónom a ľuďom riešiť dôsledky v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti spôsobené transformáciou smerom k energetickým a klimatickým cieľom Únie na rok 2030 a k dosiahnutiu cieľa klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie do roku 2050 na základe Parížskej dohody (FST) / Bez kategórie regiónu

Žiadateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Hlavný cieľ NP: Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zmierniť dôsledky ukončenia ťažby a spaľovania uhlia na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (ďalej len „HBP“) a Slovenské elektrárne, a.s., odštepný závod Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostolánoch (ďalej len „ENO“) a vytvoriť podmienky pre ich prechod z upadajúceho odvetvia ťažby hnedého uhlia a transformujúceho sa odvetvia energetiky do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikáciu, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností

NP PODPORA ZAMESTNATEĽNOSTI V REGIÓNE HORNÁ NITRA II.

PREHĽAD ČERPANIA ROZPOČTU NFP

| | Subjekt | Rozpočet | Zúčtovaná výška FP | Nezúčtovaná výška FP |
|----|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1. | 36126624 - Trenčiansky samosprávny kraj | 1 805 610,77 € | 1 440 236,29 € | 365 374,48 € |
| 2. | 35829052 - Slovenské elektrárne, a.s. | 854 516,99 € | 854 516,99 € | 0 € |
| 3. | 36005622 - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. | 10 481 834,49 € | 9 410 398,22 € | 1 071 436,27 € |
| | SPOLU | 13 141 962,25 € | 11 705 151,50 € | 1 436 810,75 € |

NP PODPORA ZAMESTNATEĽNOSTI V REGIÓNE HORNÁ NITRA II.

PREHĽAD PARTICIPANTOV

| Kategória | Počet osôb | Poznámka |
|---------------------------------------|------------|--|
| Celkový počet účastníkov (spustenie) | 763 | Účastníci, ktorí vstúpili do projektu od decembra 2023 |
| Zamestnanci HBP (počiatočná fáza) | 718 | Kľúčová cieľová skupina |
| Zamestnanci SE/ENO (počiatočná fáza) | 45 | So zamestnancami ENO sa už v predĺženej fáze projektu nepočíta |
| HBP – Celkový počet (po aktualizácii) | 831 | 718 (pôvodní) +68 (pokračujúci od 1.2.2025) |

NP PODPORA ZAMESTNATEĽNOSTI V REGIÓNE HORNÁ NITRA II.

PLNENIE MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV

| Merateľný ukazovateľ | Cieľ (po dodatkoch)/osôb | Skutočný stav k 19.02.2026 | Plnenie |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| P0128 – počet zapojených účastníkov | 845 (revidované na 801) | 913 | 108 % |
| PR059 – úspešní absolventi | 700 | 831 | 109 % |

NP PODPORA ZAMESTNATEĽNOSTI V REGIÓNE HORNÁ NITRA II.

ANALÝZA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT A DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV

| | Oblasť/Zameranie | Príklady konkrétnych kurzov | Počet kurzov | Hodnotenie a súvislosť s trhom |
|----|------------------------------------|--|--------------|---|
| 1. | Kovoobrábanie a technická príprava | Zváranie (ZK 141, ZK 111-1, MAG, CO2), obsluha žeriavov, viazač bremien, elektrotechnika (§23). +2 | 38 | Reaguje na vysoký dopyt po kvalifikovaných remeselníkoch v priemyselných parkoch regiónu. |
| 2. | Logistika a manipulácia | Vodič VZV (všetky triedy), pracovník skladu, manipulant, obsluha motorových vozíkov. +1 | 32 | Využíva disciplínu a organizačné schopnosti z baní, ktoré sú kľúčové pre logistické centrá. +1 |
| 3. | Stavebníctvo a infraštruktúra | Obsluha stavebných strojov (rýpadlá, nakladače), stavebný pracovník, liate epoxidované podlahy. | 16 | Podpora pre transformáciu infraštruktúry regiónu a rozvíjajúci sa stavebný sektor. |
| 4. | IT a digitálne kompetencie | Umelá inteligencia (AI, ChatGPT), MS Excel, Word, grafika (Canva), programovanie, tvorba webov. +1 | 18 | Zvyšuje digitálnu gramotnosť staršej vekovej skupiny (50-59 r.) pre administratívne pozície. +2 |
| 5. | Ekológia a udržateľnosť | Kurz kompostovania a pôdy, živá záhrada, permakultúra, záhradníctvo, včelárstvo. +1 | 12 | Súladi s cieľmi Fondu na spravodlivú transformáciu (FST) smerom k zelenej ekonomike. +1 |
| 6. | Služby a remeslá | Barber, tatér, kuchár, pečenie francúzskych dezertov, fyzioterapia, wellness pracovník. +1 | 10 | Podpora mikropodnikania a služieb, ktoré v regióne po útlme baníctva chýbali. +1 |
| 7. | Ostatné (Jazyky a Soft Skills) | Angličtina, nemčina, základné manažérske zručnosti, školník, údržbár. | 6 | Posilnenie uplatniteľnosti v medzinárodných firmách a rozvoj kariérneho postupu. |

Aktuálny stav implementácie finančných nástrojov v rámci priority 8P1

– informuje Slovak Investment Holding

Podpora sociálnej ekonomiky

Portfóliový úver so zdieľaným rizikom (PRSL – Portfolio Risk Sharing Loan)

„Úverový nástroj na podporu projektov sociálnej ekonomiky a sociálneho bývania“

- **Štruktúra nástroja: 4 komponenty:**

Komponent A - Sociálne podnikanie pre menej rozvinutý región (v rámci špecifického cieľa RSO4.1.)

Komponent B - Sociálne podnikanie pre viac rozvinutý región (v rámci špecifického cieľa RSO4.1.)

Komponent C - Sociálne podnikanie pre okresy Fondu spravodlivej transformácie (v rámci špecifického cieľa JSO8.1.)

Komponent D - Sociálne bývanie (v rámci špecifického cieľa RSO4.3.)

- **Celková alokácia nástroja: 43,668,000.00 EUR**

Komponent A: 25,065,000.00 EUR

Komponent B: 1,500,000.00 EUR

Komponent C: 5,603,000.00 EUR

Komponent D: 11,500,000.00 EUR

- **Implementácia nástroja: finanční sprostredkovatelia tzn. bankové subjekty**

- **Zložky nástroja:**

Zdieľaný úver: miera spolufinancovania finančného sprostredkovateľa = 50%;

Grantový komponent: investičný grant pre Komponenty A/B/C -> po splnení podmienok je poskytnuté „dodatočné“ financovanie projektu / konečného prijímateľa;

technická podpora pre Komponent D -> prostriedky určené na „preplatenie“ výdavkov sprostredkovateľa súvisiacich s prípravou budúcej investície konečného prijímateľa.

- **Cieľové subjekty:**

Sociálny podnik, podnik so sociálnym dosahom – Komponent A/B/C

Znevýhodnená fyzická osoba, zraniteľná osoba – Komponent D

- **Míľniky:**

Vyhlásenie výzvy: 24.september 2025

Zapojené finančné inštitúcie: Slovenská sporiteľňa, a.s. (oddelenie Sociálnej banky)

Aktuálny status: podpis zmluvy

Podpora podnikov

Portfóliová záruka prvej straty (FLPG – First Loss Portfolio Guarantee)

„Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorit“

- **Štruktúra nástroja:**

Komponent A - Podpora MSP a Veľkých podnikov v oblasti digitalizácie a automatizácie – menej rozvinutý región(v rámci špecifického cieľa RSO1.1.)

Komponent B - Podpora MSP – menej rozvinutý región (v rámci špecifického cieľa RSO1.3.)

Komponent C - Podpora MSP – viac rozvinutý región(v rámci špecifického cieľa RSO1.3.)

Komponent D – Podpora MSP v transformujúcich sa regiónoch (FST) (v rámci špecifického cieľa JSO8.1.)

Komponent E – Podpora MSP, Veľkých podnikov a subjektov vedecko-výskumného sektora v oblasti digitalizácie a automatizácie a VaV – menej aj viac rozvinutý región

- **Celková alokácia nástroja: 263,829,803.94 EUR**

Komponent A: 56,022,408.97 EUR

Komponent B: 114,845,938.38 EUR

Komponent C: 20,238,095.24 EUR

Komponent D: 44,723,361.35 EUR

Komponent E: 28,000,00.00 EUR

- **Implementácia nástroja: finanční sprostredkovatelia tzn. bankové subjekty**

- **Zložky nástroja:**

Záruka: 80% krytie na individuálnom úvere, 25% krytie celého portfólia;

Grantový komponent: grant vo forme mimoriadnej splátky istiny úveru -> po splnení podmienok je poskytnuté „dodatočné“ financovanie na realizovanie mimoriadnej splátky istiny úveru, výška grantovej zložky závisí od samotného Komponentu (všeobecne od 0-25% podľa regionálneho princípu) + možnosť dodatočných grantových zložiek v závislosti od daného Komponentu (digitalizácia a automatizácia/obehové hospodárstvo , výdavky v NRO, výdavky v okresoch FST).

Podpora podnikov

Portfóliová záruka prvej straty (FLPG – First Loss Portfolio Guarantee)

„Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít“

- **Cieľové subjekty:**

v závislosti od samotného Komponentu, avšak všeobecne sa podporujú MSP a Veľké podniky, alebo Subjekty vedecko – výskumného sektora v oblasti digitalizácie a automatizácie a VaV.

- **Režim pomoci:**

minimálna pomoc v zmysle schémy minimálnej pomoci č. DM – 46/2024 vo forme nepriamej (poskytnutie bankovej záruky) aj priamej (grant vo forme mimoriadnej splátky istiny úveru) pomoci.

- **Míľniky:**

Vyhlásenie výzvy: 1. september 2024

Zapojené finančné inštitúcie: Slovenská sporiteľňa, a.s.; Všeobecná úverová banka, a.s.; Tatra banka, a.s.; Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.; Československá obchodná banka, a.s.; BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky.

Podpora podnikov

Portfóliová záruka prvej straty (FLPG – First Loss Portfolio Guarantee) „Záručný nástroj na podporu MSP a ďalších vybraných priorít“

- Zazmluvnená suma:**

| Región | Zazmluvnená výška úveru | Predpokladaná výška záruky a grantu (zdroje NDF III.) | Predpokladaná záruka EÚ + ŠR | Predpokladaný grant EÚ + ŠR | Počet zazmluvnených úverov | Počet zazmluvnených podnikov |
|-------------|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | počet | počet |
| BBSK | 5 421 506,42 | 1 897 286,78 | 881 054,93 | 1 016 231,85 | 24 | 22 |
| Horná Nitra | 1 709 440,95 | 550 021,10 | 289 854,96 | 260 166,14 | 24 | 22 |
| KSK | 2 924 026,37 | 1 004 656,11 | 479 842,57 | 524 813,54 | 17 | 17 |
| Spolu | 10 054 973,74 | 3 451 963,99 | 1 650 752,46 | 1 801 211,53 | 65 | 61 |

- Čerpaná suma:**

| Región | Čerpaná výška úveru | Prepočítaná výška záruky a grantu (zdroje NDF III.) | Prepočítaná záruka EÚ + ŠR | Prepočítaný grant EÚ + ŠR | Vyplatený grant | Počet čerpaných úverov | Počet čerpaných úverov s vyplateným grantom |
|-------------|---------------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | počet | počet |
| BBSK | 3 329 538,87 | 1 145 323,46 | 546 053,88 | 599 269,58 | 360 857,24 | 22 | 9 |
| Horná Nitra | 1 420 776,18 | 457 648,37 | 240 781,95 | 216 866,42 | 100 640,03 | 24 | 12 |
| KSK | 1 536 353,21 | 516 304,18 | 255 012,26 | 261 291,92 | 92 102,50 | 15 | 5 |
| Spolu | 6 286 668,26 | 2 119 276,01 | 1 041 848,09 | 1 077 427,92 | 553 599,77 | 61 | 26 |

Podpora energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách v transformujúcich sa regiónoch (špecifický cieľ JSO8.1.);

- 28. januára SIH aktualizoval výzvu pre finančné inštitúcie, ktorá bola rozšírená o komponent **energetickej efektívnosti vo verejných budovách vo vybraných okresoch podporovaných z Fondu spravodlivej transformácie.**
- Subjekty verejnej správy, územnej samosprávy majú možnosť žiadať od finančných inštitúcií úver na obnovu budov, ktoré majú vo svojom vlastníctve alebo spoluvlastníctve. Po ukončení realizačnej fázy a dosiahnutí **úspory primárnej energie** minimálne **30%**, im bude **odpustená istina úveru do výšky 49 %.**
- **28,57 mil. EUR**, ktoré sú vyčlenené v rámci **FST na obnovu verejných budov bude viazaných na grantovú zložku** teda **49 %** odpustenia istiny a **záruku**. V praxi to umožní **poskytnúť približne 47 mil. EUR na obnovu verejných budov** vo vybraných okresoch FST.
- **Obnova budov** bude možná aj **prostredníctvom energetických služieb** čo umožní samosprávam **nezvyšovať verejný dlh.**
- V rámci oprávnených nákladov je možné mimo klasických opatrení spojených s úsporou energií financovať aj **opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy a opatrenia na zlepšenie vnútorného prostredia.**
- **Zapojenie** do nástroja nám **avizovali 4 banky**, s ktorými prebieha intenzívna komunikácia. **Spustenie implementácie nástroja** očakávame v **II.Q 2026.**
- Súčasne prebieha komunikácia pripravovaných finančných produktov na úrovni vybraných okresov v rámci FST.

Informácie k 3. zmene Programu Slovensko
a k novej priorite 8P2 v rámci
Modernizovanej politiky súdržnosti (cenovo
dostupné bývanie)

– informuje RO a Slovak Investment Holding

Modernizovaná politika súdržnosti

Názov priority: 8P2. Fond na spravodlivú transformáciu - MPS

Indikatívna alokácia: 5 500 000 eur

Súvisiace typy akcií: Zvyšovanie cenovej dostupnosti nájomného bývania prostredníctvom zapojenia finančných nástrojov

Oprávnení žiadatelia: Slovak Investment Holding, a.s.

Plánovaný termín vyhlásenia výzvy: 3Q/2026

Hlavný cieľ FN: Cenovo dostupné a udržateľné bývanie prispeje k sociálnej stabilite regiónov, k udržaniu a prilákaníu pracovnej sily a zmierneniu dopadov transformácie na zraniteľné skupiny.

Dostupný Domov j.s.a.



- Pozitívny príklad verejno – súkromného partnerstva
- Spoločná investícia fondov manažovaných Slovak Investment Holding, a.s. a Slovenskej sporiteľne, a.s.
- Investícia na báze pari-passu
- Celková výška investície: 50 mil. EUR
(25 mil. EUR fondy SIH + 25 mil. EUR spoluinvestor)
- **Filozofia spoločnosti:** prostredníctvom ziskovej hospodárskej činnosti dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv – pomôcť znevýhodneným skupinám obyvateľstva dostať sa k primeranému bývaniu

Dostupný Domov j.s.a.



Čo spoločnosť robí?

- Kúpa, rekonštrukcia, dovybavenie a správa bytov
- Prenájom bytov spolupracujúcim NGO, ktoré následne uzatvárajú podnájomné zmluvy
- Prenájom bytov priamo ľuďom z cieľovej skupiny

Dostupný Domov j.s.a.



Cieľové skupiny:

1. Znevýhodnené osoby
2. Zraniteľné osoby
3. Nízkopríjmové osoby
4. Osoby s potrebou mobility alebo adaptability

Dostupný Domov j.s.a.



Spoločnosť v číslach:

- 412 bytov
- 15 miest, 8 regiónov
- 15 spolupracujúcich organizácií (poskytovatelia sociálnej služby)
- 1313+ ubytovaných ľudí (z toho 869⁴⁶ z cieľovej skupiny)

Dostupný Domov j.s.a.



Informácie k zmenám v priorite 8P1 mimo Modernizovanej politiky súdržnosti – *informuje RO*

Zmeny mimo Modernizovanej politiky súdržnosti v priorite 8P1

Presun alokácie – opatrenie 8.2.1 „Podpora čistej energie“:

- **presun finančných prostriedkov:** 10 556 693 eur
- **presun z aktivity:**
 - „zavádzanie udržateľných technológií v oblasti obehového hospodárstva vrátane rozvoja nových spracovateľských kapacít“ v gescii MŽP SR;
- **do aktivity:**
 - „zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov vrátane podpory inteligentných a inovatívnych riešení“ v gescii SIEA;
- **finančné prostriedky realokované v prospech výzvy SIEA:**
 - „Výzva na podporu energetickej efektívnosti verejných budov regiónu hornej Nitry“.

Inštitucionálna zmena:

- Vypustenie MŽP SR ako sprostredkovateľského orgánu pre FST;
- Úprava zapracovaná v dokumente *Plán spravodlivej transformácie územia*, časť 3 – Mechanizmy riadenia.

DISKUSIA

2. Návrh na presun alokácie v rámci priority 8P1.
Fond na spravodlivú transformáciu Programu
Slovensko z opatrenia 8.2.1 Podpora čistej energie
do opatrenia 8.2.2 Revitalizácia a rekonverzia
priemyselných území

Prerokovanie a hlasovanie
(Predkladateľ – MIRRI SR)

Bod 2 - Návrh na presun alokácie v rámci priority 8P1. Fond na spravodlivú transformáciu Programu Slovensko v gescii MIRRI SR

| Opatrenie | Aktivita | Alokácia v EUR (zdroj EÚ) | |
|---|--|---|-------------------|
| | | | |
| 8.2.1 Podpora čistej energie | Výstavba zariadení na výrobu OZE a zeleného vodíka a ich využívanie v energetických systémoch vrátane diaľkového vykurovania a chladenia, podpora zavádzania inteligentných energetických systémov vrátane uskladňovania OZE | Súčasná alokácia | 89 090 616 |
| | | Alokácia, ktorá je predmetom navrhovanej úpravy | - 4 093 459 |
| | | Nová navrhovaná alokácia | 84 997 157 |
| 8.2.2 Revitalizácia a rekonverzia priemyselných území | Zmena účelu a opätovné využitie opustených priemyselných území a obnova pôdy | Súčasná alokácia | 5 000 000 |
| | | Alokácia, ktorá je predmetom navrhovanej úpravy | + 4 093 459 |
| | | Nová navrhovaná alokácia | 9 093 459 |



DISKUSIA

3. Rôzne

Informácia o aktuálnom stave II. piliera
Mechanizmu spravodlivej transformácie
(Public Sector Loan Facility)
- informuje EK (DG REGIO)

PRVNÍ VÝZVA ÚVĚROVÉHO NÁSTROJE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR (2022-2025)

- **Půjčky EIB kombinované s grantem of EK ve výši 25% úvěru**
- **REGIO prezentovalo nástroj na Slovensku**
 - duben 2023: Monitorovací výbor / Komise pro spravedlivou transformaci
 - Tour po krajích:
 - duben 2024 Košice
 - červen 2024 Banská Bystrica, Bojnice, Trenčín
- **Rezervováno či vyplaceno 680 milionů EUR z 1,31 miliardy (52%)**
 - CZ 110.95 / 112.00
 - BG 88.36 / 88.36
 - FR 76.5 / 78.1
 - ES 59.27 / 59.27
 - EL 52.95 / 56.63
 - **SK 12.86 / 31.32**
 - PL, AT, HU, PT... 0

Úspěšné slovenské projekty v rámci první výzvy (2022-2025)

1) Modernizácia verejných služieb a infraštruktúry pre spravodlivú transformáciu v Banskobystrickom kraji

- Program zrekonstruuje:
 - 20 vzdelávacích zariadení
 - 16 zariadení sociálnej péče
 - 5 kultúrnych objektů
- obnoví 67 km regionálnych silnic
- integrovaný systém ERP pro posílení finančního řízení, veřejného zadávání a reportingu.




Tyto investice přinesou přibližně 2 459 MWh ověřených ročních úspor energie, přičemž zajistí, že všechny modernizované budovy dosáhnou energetické třídy B (EPC), budou splňovat standardy bezbariérovosti a budou digitálně vybavené.

Úspěšné slovenské projekty v rámci první výzvy (2022-2025)

2) Spravedlivá transformace: Infrastruktura v Košicích

- Program zrekonstruuje:
 - 3 základní a jednu mateřskou školu
 - Sociální bydlení pro 102 obyvatel
 - 2 polikliniky
 - Administrativní budovu Správy městské zeleně
 - 2 budovy ZOO
 - 3 silniční projekty (vč. cyklostezek a podchodu)
- Ener. úspory 1050 MWh ročně



Úspěšné slovenské projekty v rámci první výzvy (2022-2025)

3) Dopravní podnik města Košice

- Rekonstrukce 5 budov
- Nákup 10 elektrických autobusů
- Ušetří 2000 tun CO2 ročně



DRUHÁ VÝZVA ÚVĚROVÉHO NÁSTROJE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR (2026-2027)

- Již nejsou uplatňovány národní alokace – celoevropská soutěž projektů
- Termíny: leden/červen/září 2026, únor 2027
- Zbývající rozpočet: cca **630** milionů EUR


- **Spolupráce se Slovenskou spořitelnou jako zprostředkovatelem EIB**
- Předpoklad prvních projektů v dubnu 2026

- Leden 2026: přijaty žádosti celkem ve výši **783 milionů EUR**
- Mezi nimi žádný slovenský
- Výsledky vyhodnocení budou na konci března 2026
- Dubnový termín: zbývající rozpočet nejasný
- Typicky část projektů vypadává nebo se redukuje
 - možné uvolnění prostředků v budoucích měsících


3. Rôzne

Informácia o REGIOSTARS - informuje EK

REGIOSTARS 2025: Number of applications 2017-2025

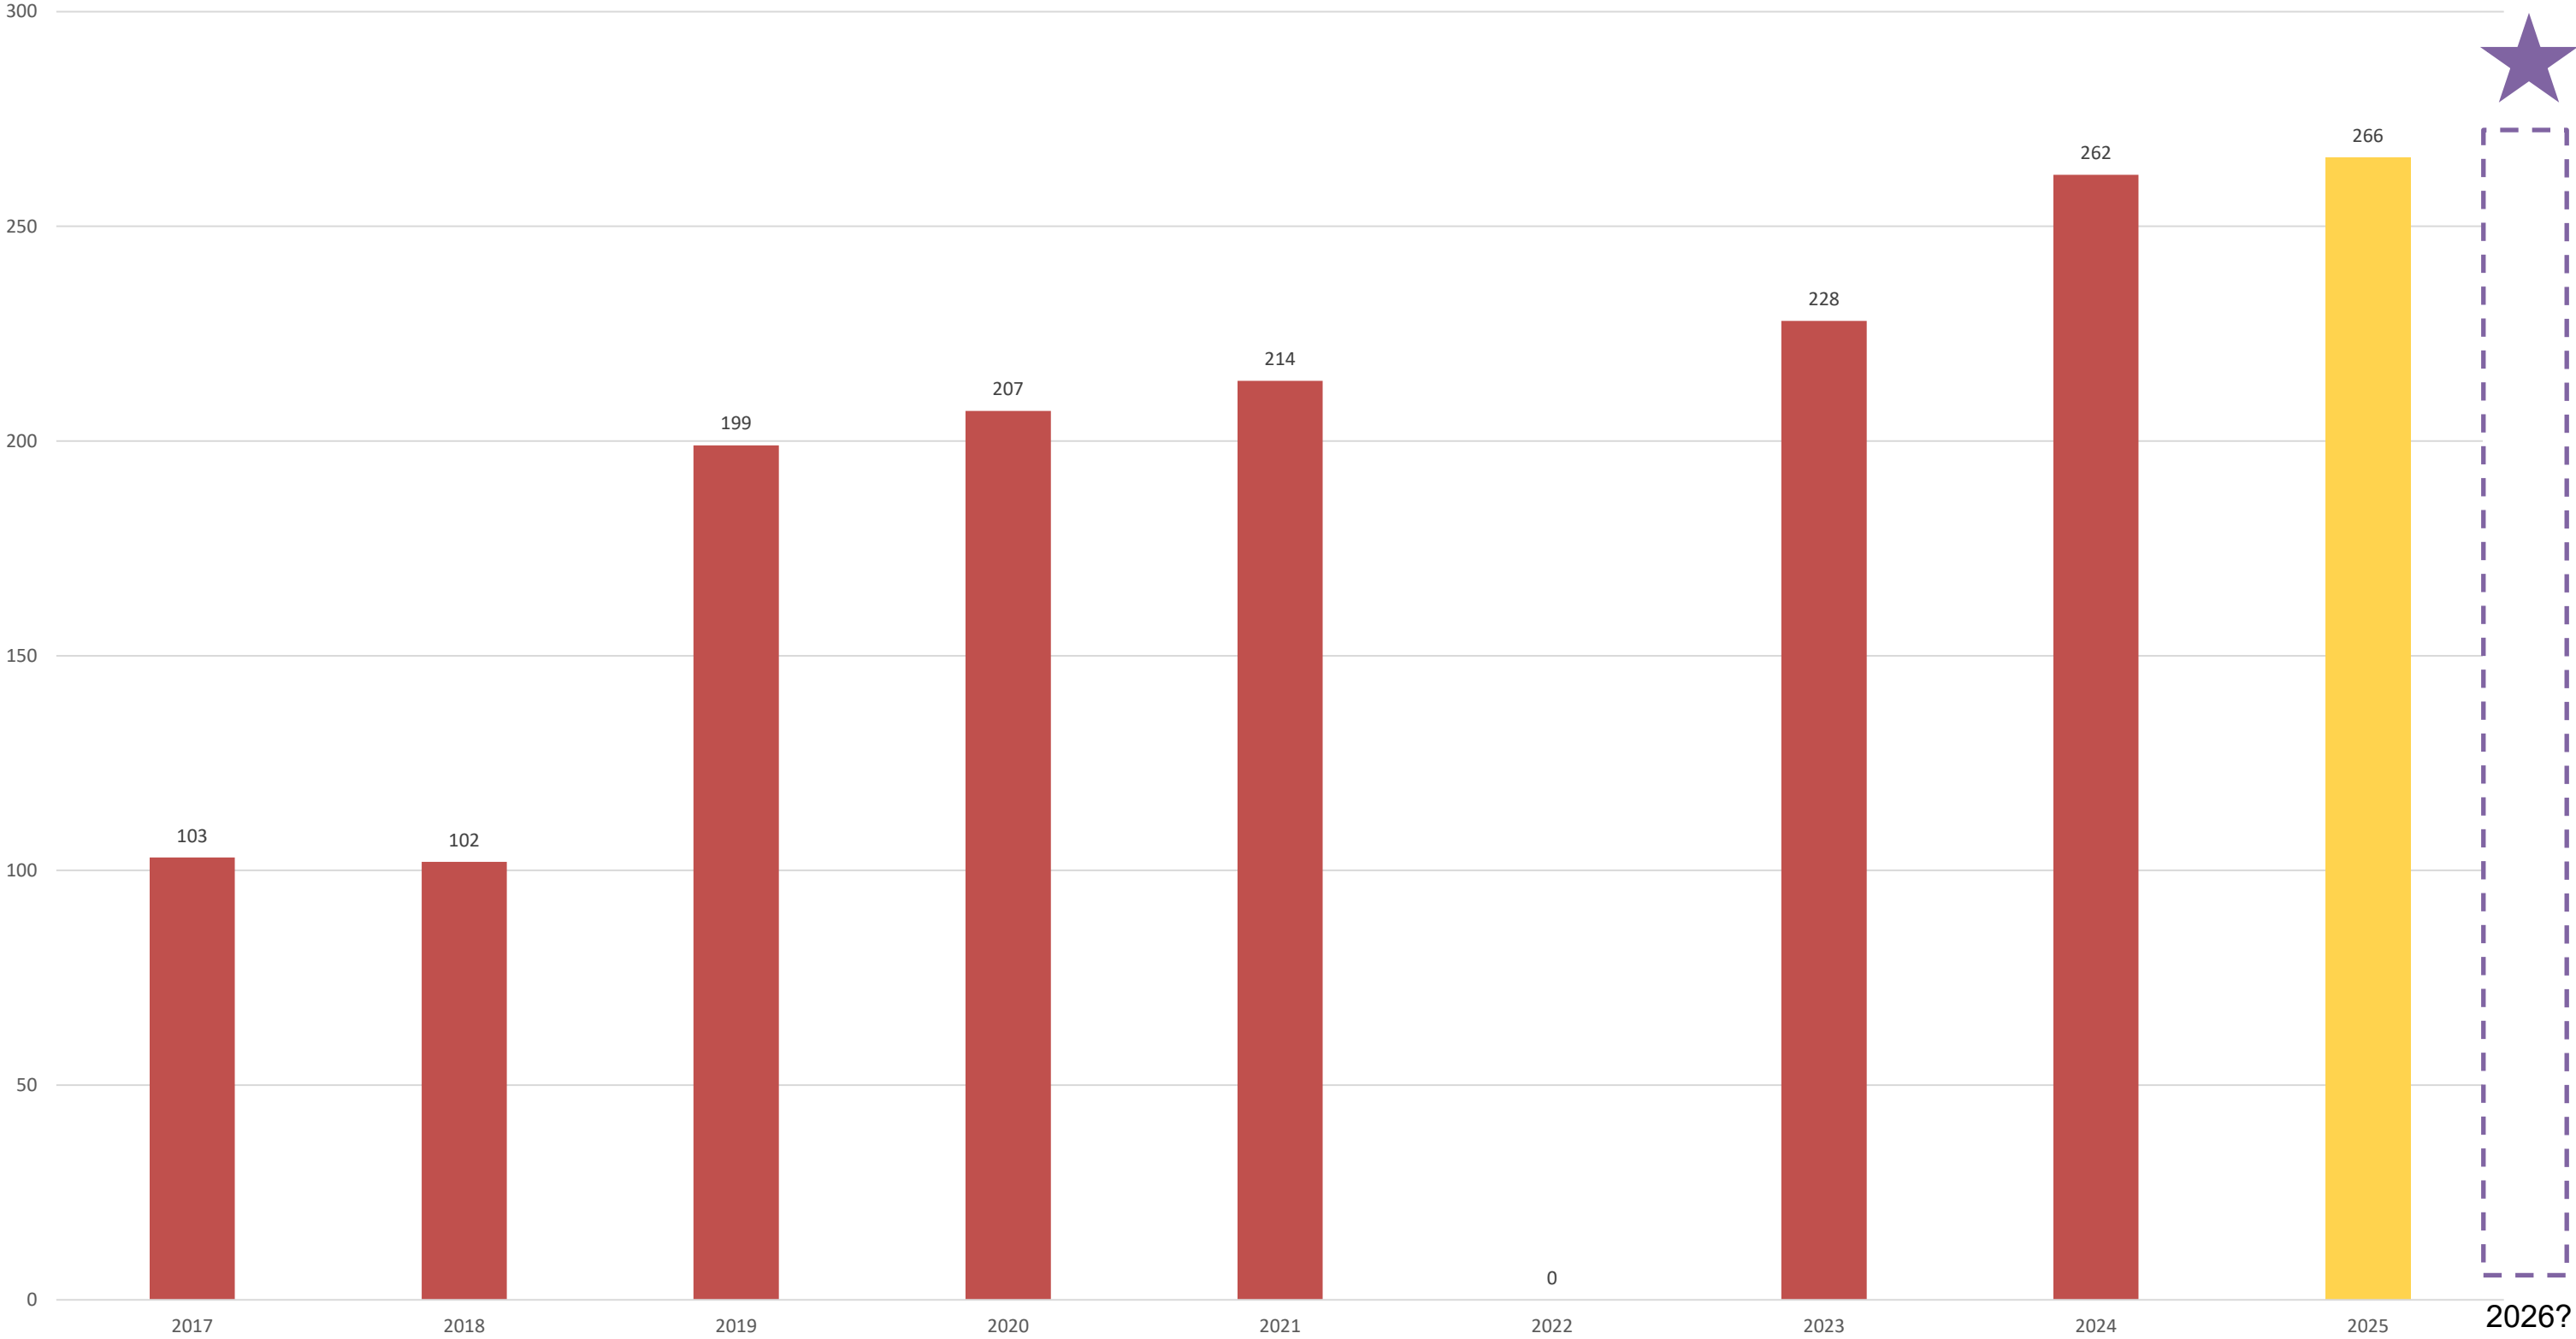

REGIOSTARS 2025: applications – country overviews

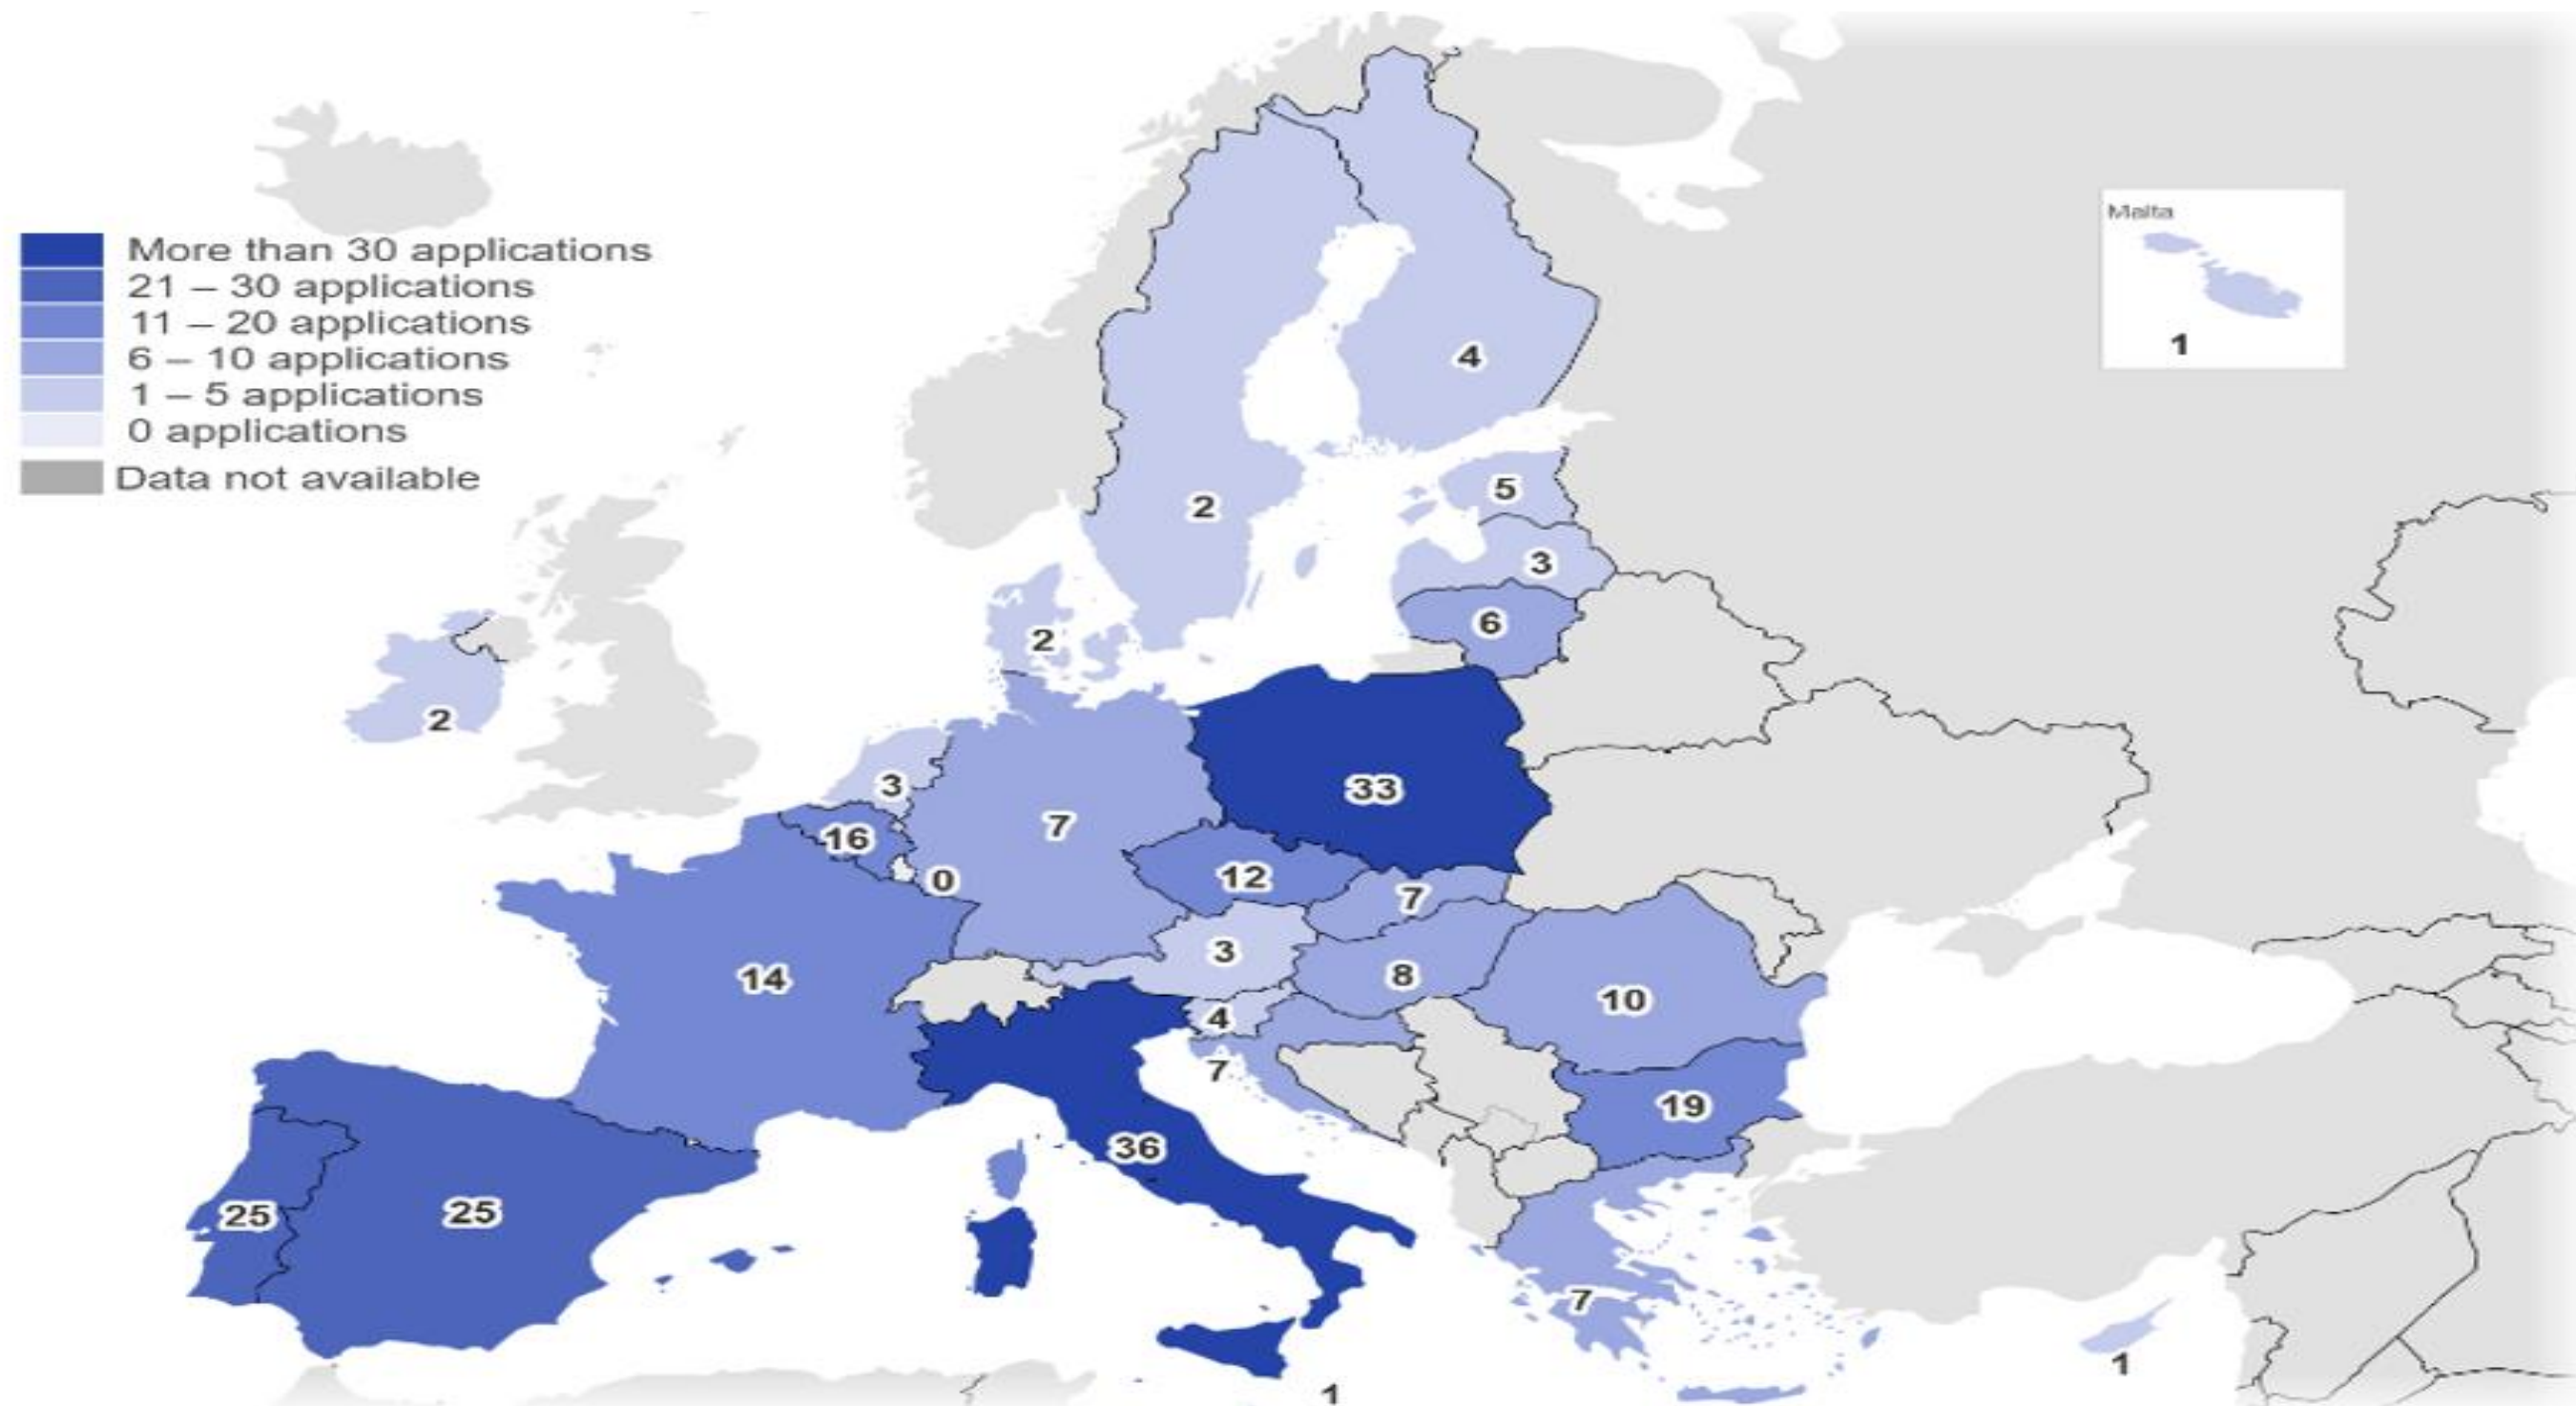



*Can we get to 300 applications?
Can we keep the geographical reach?*

APPLICATIONS are OPEN

.... help us mobilising good projects to apply !



Structure of the competition

- Cohesion policy projects
- Competition categories (5) aligned to Policy objectives (2021-2027)
- 2 phases in the selection process (February – October)
 - **First stage:** an assessment of all applications on paper and a selection of up-to 5 finalists per category by an independent jury.
 - **Second stage:** a ‘live’ presentation of the finalists in front of the jury after which the winners will be decided.
- Guide for applicants in all EU languages

All information available on [the REGIOSTARS website](#).

Eligibility of a project

- The project has received EU co-financing from **the ERDF, CF, ESF, JTF, INTERREG**, starting earliest on 1 January 2014.
- Only **completed projects** are considered.
- Application submitted via the online platform **by 22 May 2026**.
- Applications must be in an official EU language.
- The application includes an endorsement letter of the Managing Authority.
- The project to refer to one of the five award categories.

Award criteria - evaluation

Cohesion

The contribution of the project to economic, social and territorial cohesion at large; with a supraregional to European perspective.

A project's added value in relation to cohesion will be evaluated here.

Impact

The local and regional impact of the project and the quality of the final results.

How did the project change something for the better in its region?

Innovation

The innovative character of the project within the logic of the selected award category.

*What is new? What has not been done before?
Innovation may be understood in economic, social and/or ecological terms.*

Award criteria - evaluation

Sustainability

The potential of the project to last into the future, in terms of economic sustainability. Efforts of the project to live beyond the actual project life-time should be demonstrated.

Citizens

How citizens and actors of civil society got involved in the development and/or implementation of the project.

Transferability

The potential of the project to be transferred to other regions in Europe and, in the best case, to be upscaled and rolled out across the European Union.

How to apply?

What information will you provide?

- Contact details & key project information
- Description of the project (short/long)
- Project's key features (contribution to award criteria):
 - contribution to cohesion;
 - impact, innovation, sustainability;
 - citizens' engagement and transferability.
- Attachments:
 - managing authority endorsement letter;
 - 1-3 photos.

***....applications to be submitted exclusively online through REGIOSTARS
applications form on EU Survey***

REGIOSTARS 2026 timeline

Phase 1: Application & Finalist Selection

February 10 Competition Launch

The official start for projects to submit their entries for consideration.



July 14 Finalists Announced

Successful projects are revealed following the official eligibility check.



May 22 Application Deadline

The final date for all project submissions to be completed.



Phase 2: Voting, Pitching & Winners

October 13-14 (tbc) The Grand Finale

Finalists pitch to jurors before the official REGIOSTARS Ceremony takes place.



September 3 Public Voting Opens

The community begins voting for their favorite regional projects online.



November 1 Winner Campaigns

Local promotional campaigns begin to celebrate and showcase the winning projects.



REGIOSTARS 2025 Winners



Satellite radar-based fertilisation maps

Poland



AGEO - Atlantic Geohazard Risk Management

Portugal, Spain, France, Ireland, United Kingdom



MONOCAB OWL - New mobility on old tracks

Germany



Early support for families at risk

Czechia



Shankill Shared Women's Centre

United Kingdom, Ireland



REGIOSTARS Ceremony

The ceremony was truly reminiscent of the Oscar!

Important showcasing of EU Cohesion Policy, I will certainly advertise it!

It was impactful, very professional & solemn

...made us proud to be part of this European community

It was a real pleasure and an enriching experience; truly inspiring event & opportunity to meet exceptional people



Important links

- **REGIOSTARS website:** https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/region-stars-awards_en
 - Information about the competition
 - All materials available: Guide for applicants, application form, endorsement letter, frequently asked questions, visuals
- **Application form:** <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/REGIOSTARS2026>
- **Communication kit/visuals:** [to be downloaded here](#)
- **Contact:** REGIO-REGIOSTARS@ec.europa.eu

4. Záver

ĎAKUJEME



MINISTERSTVO

INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
