



5. zasadnutie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre marginalizované rómske komunity

11. máj 2026
Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bratislava



ÚRAD
SPĽNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Bod 1

Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa





Program zasadnutia

Bod 1) Úvod, schvaľovanie programu zasadnutia a voľba overovateľa

- Informácia o stave implementácie častí Programu Slovensko v pôsobnosti ÚV SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko – **informácia a diskusia**
- Harmonogram plánovaných výziev vrátane informácie o budúcom smerovaní projektu „Miestne občianske a preventívne služby“ a zabezpečení financovania jeho ďalšej fázy – **informácia a diskusia**
- Informácia o stave implementácie národných projektov ÚSVRK – **informácia a diskusia**

Bod 2) Kritéria pre výber projektov poskytovateľa ÚV SR v rámci priority 4P9 – „Dostupné bývanie“ – **prerokovanie a hlasovanie**

Prestávka

Bod 3) Prerokovanie zámeru národného projektu „Sprievodné asistenčné služby pre udržateľnosť bývania“ – **prerokovanie a hlasovanie**

Bod 4) Prerokovanie zámeru národného projektu „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – II. fáza“ – **prerokovanie a hlasovanie**

Bod 5) Prerokovanie zámeru národného projektu „Rozvojové tímy II.“ – **prerokovanie a hlasovanie**

Prestávka na obed

Bod 6) Rôzne

- Prezentácia projektu technickej pomoci ako projektu, ktorého celkové náklady presahujú 10 mil. EUR – **informácia**
- Informácia o stave informovanosti za ÚV SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko – **informácia a diskusia**
- Hodnotenie implementácie rozpočtu Programu Slovensko na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít – **informácia a diskusia**
- Správa o stave plnenia investičných plánov čerpania k 31.12.2025 – **informácia a diskusia**
- Informácia o súťaži REGIOSTARS – **informácia**
- Stratégia EÚ pre boj proti chudobe – **informácia**

Bod 7) Záver





Informácia o stave implementácie častí Programu Slovensko v pôsobnosti ÚV SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko





Prehľad alokácie výziev, kontrahovania a čerpania

Dáta k 27.4.2026

EFRR a ESF+	máj 2026		jún 2025		pokrok	
	mil. EUR	%	mil. EUR	%	mil. EUR	%
Alokácia ÚSVRK	431,5	100				
Vyhlásené výzvy	367,3	85,1	364,6	84,5	+ 2,7	+ 0,6
Schválené žiadosti	348,2	80,7	229,04	53,1	+ 119,2	+ 27,6
Kontrahovanie	285,7	66,2	202,7	47	+ 83,0	+ 19,2
Čerpanie*	87,2*	20,2	48,2	11,2	+ 39	+ 9,0

*Čerpanie – refundácie, zúčtovanie predfinancovaní a zúčtovanie zálohových platieb.

- Prijímateľom **vyplatených 122,5 mil. EUR** (zálohové platby, poskytnuté predfinancovania) a z toho zúčtovaných 64,9 mil. EUR, čo znamená, že v najbližšom období môžeme **očakávať** nárast čerpania o **57,6 mil. EUR** (spolu to môže tvoriť čerpanie v najbližšom období na úrovni 144,8 mil. EUR)





Vyhlásené výzvy ESF+

p. č.	Kód výzvy	Názov výzvy	Typ výzvy	Stav výzvy	Alokácia výzvy (EÚ zdroj)
1	PSK-UV-001-2023-DV-ESF+	Miestne občianske a preventívne služby	Otvorená	Uzavretá	82 000 000
2	PSK-UV-002-2023-NP-ESF+	Národný projekt Rozvojové tímy I.	Uzavretá	Uzavretá	59 200 000
3	PSK-UV-003-2023-NP-ESF+	Národný projekt „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza“	Uzavretá	Uzavretá	3 292 751
4	PSK-UV-004-2023-NP-ESF+	Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami	Uzavretá	Uzavretá	17 275 459
5	PSK-UV-005-2024-DV-ESF+	Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav	Otvorená	Vyhlásená	8 927 955
6	PSK-UV-011-2024-DV-ESF+	Miestne občianske a preventívne služby II.	Uzavretá	Uzavretá	1 069 000
7	PSK-UV-012-2024-NP-ESF+	<i>Komplexný systém podpory marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom misijno-pastoračných centier (NP MPSC)</i>	Uzavretá	Uzavretá	4 500 000
8	PSK-UV-013-2024-NP-ESF+	<i>Asistencia a podpora samosprávam pri zabezpečovaní opatrení na zrýchlenie sociálno- ekonomickej integrácie marginalizovaných skupín obyvateľov – 1. fáza (NP APS I.)</i>	Uzavretá	Uzavretá	11 000 000
		spolu			187 265 165





Vyhlásené výzvy EFRR

p. č.	Kód výzvy	Názov výzvy	Typ výzvy	Stav výzvy	Alokácia výzvy (EÚ zdroj)
1	PSK-UV-006-2024-DV-EFRR	Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy	Otvorená	Uzavretá	65 884 329
2	PSK-UV-007-2024-DV-EFRR	Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)	Otvorená	Uzavretá	50 150 400
3	PSK-UV-008-2024-DV-EFRR	Rozšírenie kapacít základných škôl v obciach s prítomnosťou MRK v Bratislavskom samosprávnom kraji	Otvorená	Uzavretá	4 999 669
4	PSK-UV-009-2024-DV-EFRR	Výzva pre zlepšenie podmienok bývania v obciach z Atlasu rómskych komunít	Otvorená	Uzavretá	44 000 000
3	PSK-UV-010-2024-DV-EFRR	Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre žiakov z MRK prostredníctvom investícií do infraštruktúry základných škôl	Otvorená	Uzavretá	15 000 000
		spolu			180 034 398

- Na základe schválenej revízie sa plánuje nevýšenie finančných prostriedkov vo výzve 007 v opatreniach 2.5.3 a 2.5.5, táto zmena je v súčasnosti v procese schvaľovania. Zmenou bude celková alokácia vo výzvach navýšená o 10,9 mil. EUR.





Stav ESF+ žiadostí a projektov

			Predložené žiadosti		Žiadosti v konaní (zásobník)		Schválené žiadosti		Kontrahovanie		Čerpanie
05/2026	Kód/názov výzvy	alokácia	počet	Suma	počet	suma	počet	suma	počet	suma	suma
ESF+	PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ PSK-UV-011-2024-DV-ESF+ <i>Miestne občianske a preventívne služby</i>	83 069 000	471	88 349 891,99	0 (5)	0 (473 417,80)	432	82 247 254,41	431	81 843 096,24	59 290 217,07
	PSK-UV-002-2023-NP-ESF+ <i>NP – Rozvojové tímy I</i>	59 200 000	1	59 110 669,33	0 (0)	0 (0)	1	59 110 669,33	1	49 464 019,33	22 131 091,38
	PSK-UV-003-2023-NP-ESF+ <i>NP - Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík</i>	3 292 751	1	3 326 164,74	0 (0)	0 (0)	1	3 326 164,74	1	3 221 187,72	1 300 964,71
	PSK-UV-004-2023-NP-ESF+ <i>NP – Asistencia obciam pre MRK (pozemky)</i>	17 275 459	1	17 585 536,53	0 (0)	0 (0)	1	17 280 949,50	1	9 858 767,02	2 448 648,02
	PSK-UV-005-2024-DV-ESF+ <i>Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom</i>	8 927 955	120	9 641 220,80	17 (0)	491 099,49 (0)	94	8 477 942,31	92	7 934 833,65	176 973,48
	total	171 765 165	594	178 013 483,39	17 (5)	491 099,49 (473 417,80)	529	170 442 980,29	526	152 321 903,96	85 347 894,66
	% z celkovej alokácie ESF+					0,2 % (0,2%)		84,4 %		75,4 %	42,3 %





Stav EFRR žiadostí a projektov

			Predložené žiadosti		Žiadosti v konaní (zásobník)		Schválené žiadosti		kontrahovanie		čerpanie
05/2026	Kód/názov výzvy	alokácia	počet	suma	počet	suma	počet	suma	počet	suma	suma
EFRR	PSK-UV-006-2024-DV-EFRR PSK-UV-007-2024-DV-EFRR	116 034 729	573	223 250 176,28	26 (155)	12 229 578,97 (68 187 973,41)	288	102 761 892,81	285	101 955 794,88	1 840 365,36
	<i>Zásobovanie vodou / kanalizačné siete / čistenie odpadových vôd</i>	65 995 129	72	92 768 417,71	4 (5)	6 318 897,70 (11 539 565,78)	42	55 197 271,01	41	54 888 652,96	158 685,36
	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	7 871 000	31	8 892 394,77	2 (0)	558 681,82	26	7 117 335,39	26	7 117 335,39	323854,68
	<i>sanácia / odpadové hospodárstvo</i>	3 367 000	46	4 157 508,57	8 (0)	909 264,69	24	2 288 485,75	22	2 161 107,92	169 426,24
	<i>Cestná infraštruktúra</i>	30 500 000	288	107 153 519,79	6 (150)	5 377 660,06 (56 648 407,63)	87	29 882 001,88	87	29 629 063,44	297 855,18
	<i>Projektová dokumentácia</i>	8 301 600	136	10 278 335,44	6	605 398,88	110	8 276 798,78	109	8 159 635,17	890 543,90
	PSK-UV-008-2024-DV-EFRR PSK-UV-010-2024-DV-EFRR Základné školy	19 999 660	39	35 927 571,19	3 (0)	3 334 693,13 (0)	22	24 389 639,65	2	4 999 337,53	0,00
	PSK-UV-009-2024-DV-EFRR Zlepšenie podmienok bývania	44 000 000	51	84 583 728,74	19 (2)	23 878 358,69 (6 095 036,56)	19	35 551 595,64	14	24 124 163,00	0,00
	total	180 034 389	663	343 761 476,21	48 (157)	39 442 630,795 (74 283 009,97)	329	162 585 964,49	300	131 079 295,39	1 840 365,36
	% z celkovej alokácie EFRR			149,8 %		17,2 % (32,4 %)		70,8 %		57,11 %	0,80 %





Vybrané ukazovatele programu

Kód	Názov merateľného ukazovateľa	Fond	Kategória regiónu	Cieľová hodnota	Zazmluvnená hodnota	Percento zazmluvnenia	Plnenie	Percento naplnenia
SRI08	Počet domácností, ktorým sa zlepšili hygienické štandardy bývania	ESF+	MRR	2 100	9 529	453,76	1 649	78,5
SRI09	Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne, sociálne, vzdelávacie, osvetové a podporné služby	ESF+	MRR	56 500	24 000	42,48	21 780	38,5
RCR41	Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou	EFRR	MRR	8 765	8 686	99,10	0	0
RCO107	Investície do zariadení na triedený zber odpadu	EFRR	MRR	9 647 059	8 850 464	91,74	0	0
RCO46	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest – mimo TEN-T	EFRR	MRR	67	62	92,54	0,4	0,6
SRI16	Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody v podmienkach MRK	EFRR	MRR	1 400	5 637	402,64	0	0
RCO65	Kapacita nového alebo modernizovaného sociálneho bývania	EFRR	MRR	2 696	1 569	58,20	0	0





Plán kontrahovania a čerpania ESF+

obdobie	kontrahovanie	Kumulatívne kontrahovanie	čerpanie	Kumulatívne čerpanie
Kontrahované/vyčerpané 31.12.2025	150 567 396,76		71 687 000,24	
2026	33 581 075,00	184 148 471,76	51 700 448,00	123 387 448,24
2027	17 851 528,24	202 000 000,00	34 283 167,00	157 670 615,24
2028		202 000 000,00	22 973 510,93	180 644 126,17
2029		202 000 000,00	17 655 873,83	198 300 000,00
2030		202 000 000,00	3 700 000,00	202 000 000,00
Suma kontrahovania / čerpania	202 000 000,00		202 000 000,00	





Plán kontrahovania a čerpania EFRR

obdobie	kontrahovanie	Kumulatívne kontrahovanie	čerpanie	Kumulatívne čerpanie
Kontrahované/vyčerpané 31.12.2025	75 749 175,43		567 768,86	
2026	86 953 952,67	162 703 128,10	35 058 774,46	35 626 543,32
2027	66 796 871,90	229 500 000,00	45 600 000,00	81 226 543,32
2028		229 500 000,00	63 350 000,00	144 576 543,32
2029		229 500 000,00	61 580 000,00	206 156 543,32
2030		229 500 000,00	23 343 456,68	229 500 000,00
Suma kontrahovania / čerpania	229 500 000,00		229 500 000,00	





Plán kontrahovania a čerpania ESF+ a EFRR

obdobie	kontrahovanie	Kumulatívne kontrahovanie	čerpanie	Kumulatívne čerpanie
Kontrahované/vyčerpané 31.12.2025	226 316 572,19		72 254 769,10	
2026	120 535 027,67	346 851 599,86	86 759 222,46	159 013 991,56
2027	84 648 400,14	431 500 000,00	79 883 167,00	238 897 158,56
2028		431 500 000,00	86 323 510,93	325 220 669,49
2029		431 500 000,00	79 235 873,83	404 456 543,32
2030		431 500 000,00	27 043 456,68	431 500 000,00
Suma kontrahovania / čerpania	431 500 000,00		431 500 000,00	





Modernizovaná politika súdržnosti

Dostupné a udržateľné bývanie

Dňa 31.3.2026 bolo prijaté Vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým Európska Komisia schválila 3. zmenu Programu Slovensko (verzia 4.1). Súčasťou revízie boli aj úpravy v súvislosti s Modernizovanou politikou súdržnosti /MPS/. ÚV SR - ÚSVRK realokoval v rámci MPS na oblasť dostupného bývania 30 mil. EUR.

Priorita	Špecifický cieľ	Opatrenie	Kategória regiónu	Fond	RO / SO	Alokácia spolu EFRR, v zmysle finančného plánu pred revíziou 4.0	navrhovaná realokácia PSK	finančný plán ÚV SR po zmene programu 4.0
2P2	-	2P2	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	75 000 000,00		71 300 000,00
		RSO2.5				57 000 000,00		59 700 000,00
2P2	RSO2.5	2.5.1 kanál	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	15 000 000,00	-5 000 000,00	10 000 000,00
2P2	RSO2.5	2.5.3 kanál	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	20 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00
2P2	RSO2.5	2.5.4 voda	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	7 000 000,00	-3 800 000,00	3 200 000,00
2P2	RSO2.5	2.5.5 voda+kanál	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	15 000 000,00	3 500 000,00	18 500 000,00
2P2	RSO2.6	2.6.2 odpady+skládky	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	18 000 000,00	-6 400 000,00	11 600 000,00
3P1	RSO3.2	3.2.4 miestne komunikácie	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	30 500 000,00		30 500 000,00
4P2	RSO4.2	základné školy	viac rozvinuté	EFRR	ÚV SR	5 000 000,00		5 000 000,00
4P2	RSO4.2	základné školy	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	15 000 000,00	6 000 000,00	21 000 000,00
4P5	RSO4.3	-	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
4P6	RSO4.3	voda+kanál+dokumentácie+bývanie	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	99 000 000,00	-27 300 000,00	71 700 000,00
4P9	RSO4.7	nová priorita MPS	menej rozvinuté	EFRR	ÚV SR	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
		SPOLU				229 500 000,00		229 500 000,00





Iné zmeny Programu Slovensko mimo Modernizovanej politiky súdržnosti

Cieľ politiky 2, Priorita: 2P2. Životné prostredie

- Realokácia zdrojov medzi opatreniami
- Úprava cieľových hodnôt programových ukazovateľov úmerne k realokácií zdrojov
- Nastavenie cieľovej skupiny v súlade s ostatnými časťami programu
- Úprava textu pre zlepšenie zrozumiteľnosti a ľahšej orientácii pri monitorovaní a hodnotení programu

Cieľ politiky 3, Priorita: 3P1. Doprava, Opatrenie 3.2.4 Miestne komunikácie

- Zosúladenie názvu typu akcie s programovou štruktúrou v ITMS21+ a s vyhlásenými výzvami
- Nastavenie cieľovej skupiny v súlade s ostatnými časťami programu
- Vypustenie programového ukazovateľa RCR56 „Časové úspory vďaka lepšej cestnej infraštruktúre“ zo záväzku poskytovateľa ÚV SR. Vzhľadom na charakter aktivít podporovaných ÚV SR (iba výstavba a modernizácia miestnych komunikácií) tento ukazovateľ nie je relevantný a nie je možné ho merať.





Iné zmeny Programu Slovensko mimo Modernizovanej politiky súdržnosti

Cieľ politiky 4, Priorita: 4P2. Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

- Navýšenie zdrojov a úprava cieľových hodnôt programových ukazovateľov úmerne k navýšeniu zdrojov

Cieľ politiky 4, Priorita: 4P5. Aktívne začlenenie a dostupné služby

- Presun zdrojov do priority 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a 2P2 Životné prostredie a súvisiaca úprava cieľových hodnôt programových ukazovateľov úmerne k navýšeniu zdrojov

Cieľ politiky 4, Priorita: 4P6. Aktívne začlenenie a dostupné služby, ESO4.10. (ESF+)

- Doplnenie a úprava aktivít - inklúzia rómskych žien do spoločnosti po výkone trestu, výkon misijnno-pastoračnej práce, podpora aktivít v oblasti bývania a ochrany zdravia (financovanie odborného personálu a školení na podporu nájomného bývania a svojpomocnej výstavby vlastného bývania pre obyvateľov v sídlach s prítomnosťou MRK)
- Zosúladenie názvu ukazovateľa SRI08 - Počet domácností, ktorým sa zlepšili, alebo ktorým sa vytvorili podmienky na zlepšenie hygienických štandardov bývania s číselníkom a ITMS21+.

Cieľ politiky 4, Priorita: 4P6. Aktívne začlenenie a dostupné služby, RSO 4.3 (ERDF)

- Odstránenie typu akcie svojpomocného bývania a úprava textácie s presnejším popisom typu akcie týkajúcej sa bývania za účelom presnejšieho zadefinovania podporených aktivít a odstránenia pochybností o rozsahu podpory.
- Presun zdrojov do novej priority 4P9 Dostupné bývanie a súvisiaca úprava cieľových hodnôt programových ukazovateľov úmerne k presunu zdrojov
- Zosúladenie názvu ukazovateľa SRI08 - Počet domácností, ktorým sa zlepšili, alebo ktorým sa vytvorili podmienky na zlepšenie hygienických štandardov bývania s číselníkom a ITMS21+.





Diskusia

Informácia o stave
implementácie častí Programu
Slovensko v pôsobnosti ÚV SR
ako sprostredkovateľského
orgánu pre Program Slovensko





Harmonogram plánovaných výziev vrátane informácie o budúcom smerovaní projektu „Miestne občianske a preventívne služby“ a zabezpečení financovania jeho ďalšej fázy





Plánované výzvy

Zameranie výzvy	Indikatívny zoznam oprávnených aktivít	Oprávnení žiadatelia	Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy	Oprávnené územie	Typ projektu	priorita	alokácia
Inkluzívne opatrenia proti diskriminácii a segregácii	Systematické iniciovanie pozitívneho osobnostného rozvoja a podpora aktivizácie členov MRK vrátane mladých ľudí, rómskych žien a dievčat	MNO (neziskové a cirkevné organizácie)	2Q/2026	Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj	dopytová výzva	4P6. Aktívne začlenenie rómskych komunít	4 000 000
Miestne obecné služby	udržanie zamestnanosti a príprava na trh práce	obce z Atlasu RK	2Q/2026	Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj	dopytová výzva	4P6. Aktívne začlenenie rómskych komunít	15 000 000
Dostupné bývanie v obciach z Atlasu rómskych komunít	Rekonštrukcia a výstavba sociálneho bývania pre obyvateľov obcí z ARK doplnené aktivitami asistentov bývania	obce z Atlasu RK	2Q/2026	Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj	dopytová výzva	4P9. Dostupné bývanie	30 000 000
NP Sprievodné asistenčné služby pre udržateľnosť bývania	Financovanie odborného personálu a školení na podporu nájomného bývania a svojpomocnej výstavby vlastného bývania pre obyvateľov v sídlach s prítomnosťou MRK	Dostupný Nájom j.s.a.	3Q/2026	Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj	výzva na predloženie národného projektu	4P6. Aktívne začlenenie rómskych komunít	4 000 000
NP Monitorovanie a hodnotenie II. fáza	systém monitorovania a hodnotenia životných podmienok rómskej populácie, predovšetkým MRK	ÚV SR/ÚSVRK	3Q/2026	Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj	výzva na predloženie národného projektu	4P6. Aktívne začlenenie rómskych komunít	2 190 000
Rozvojové tímy II.	Implementácia integrovaného komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s cieľom zlepšiť životné podmienky, podporiť sociálno-ekonomickú integráciu a znížiť mieru segregácie a diskriminácie.	ÚV SR/ÚSVRK	3Q/2026	Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj	výzva na predloženie národného projektu	4P6. Aktívne začlenenie rómskych komunít	28 272 937



Dostupné bývanie v obciach z Atlasu rómskych komunít

PSK-UV-015-2026-DV-ESF+

Základné informácie

- Plánovaný termín vyhlásenia: 2Q 2026
- Výška alokácie (EÚ zdroj): 30 000 000 EUR
- Priorita: 4P9 Dostupné bývanie
- Oprávnené územie: menej rozvinuté regióny (MRR)
- Oprávnení žiadatelia: obce z Atlasu rómskych komunít 2025
- Udržateľnosť projektov: 20 rokov
- Preukázateľnosť lokálneho charakteru a miestneho účinku v zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci

➤ **Oprávnená aktivita:** Rekonštrukcia a výstavba sociálneho bývania pre obyvateľov obcí z ARK doplnené aktivitami asistentov bývania

➤ **Oprávnené výdavky:**

- obstaranie nájomného bytu novou výstavbou, stavebnými úpravami
- rekonštrukcia nájomného bytu
- obstaranie technickej vybavenosti k nájomnému bytu (vodovodná a kanalizačná prípojka, odstavná plocha...)
- prípravná a projektová dokumentácia, stavebný dozor
- nákup pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný, interiérové vybavenie
- výdavky prijímateľa súvisiace s výkonom činnosti asistenta bývania
- rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami

Aktuálny stav: v príprave (stretnutie v rámci participatívnej prípravy je plánované na 21.5.2026)





Inkluzívne opatrenia proti diskriminácii a segregácii PSK-UV-014-2026-DV-ESF+

Základné informácie

- Plánovaný termín vyhlásenia: 2Q 2026
- Výška alokácie (EÚ zdroj): 4 000 000 EUR
- Oprávnené územie: celé územie SR
- Oprávnení žiadatelia: neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, združenia, Slovenský Červený kríž a jeho základné organizačné jednotky – územné spolky

Oprávnené aktivity

- a) Podpora vzájomného učenia, desegregácie a súdržnosti (opatrenia proti rómskemu rasizmu)
- b) Aktivizácia mladých ľudí v MRK s uplatnením inkluzívneho prístupu pre úspešné začlenenie do spoločnosti
- c) Aktivizácia rómskych dievčat a žien k ich vyššej účasti vo vzdelávaní, na trhu práce, ako aj v programoch zameraných na lepšie podmienky ich bývania a zdravia

Oprávnené výdavky

- personálne náklady na zamestnancov zabezpečujúcich realizáciu aktivít
- paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU (40% oprávnených mzdových nákladov)

Aktuálny stav: v schvaľovacom procese (stretnutie v rámci participatívnej prípravy sa uskutočnilo 5.3.2026)





Miestne obecné služby PSK-UV-016-2026-DV-ESF+

Základné informácie

- Plánovaný termín vyhlásenia: 2Q 2026
 - Výška alokácie (EÚ zdroj): 15 000 000 EUR
 - Oprávnené územie: celé územie SR (MRR a VRR)
 - Oprávnení žiadatelia: Obce z Atlasu rómskych komunít 2025
- **Oprávnená aktivita:** Podpora komplexného poskytovania miestnej obecnej služby v obciach s prítomnosťou MRK
- **Oprávnené výdavky:** Výdavky prijímateľa súvisiace s výkonom činnosti členov miestnych obecných služieb paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu

Rozdiel oproti predchádzajúcim výzvam:

- menej obcí a menší počet členov v hliadkach MOS
- finančné spolupodieľanie sa obcí na úhrade miezd zamestnancov
- rozšírenie činností členov MOS
- ďalšie oblasti vzdelávacích aktivít

Aktuálny stav: v príprave (stretnutie v rámci participatívnej prípravy sa uskutočnilo 27.4.2026, IPK)





Informácia k projektu MOaPS/MOS

Miestne občianske a preventívne služby / Miestne obecné služby

- Stretnutie na RO MIRRI, kde sa dohodla otázka financovania (MŠVVŠ, MZ, MPSVR)
- Veľká časť projektov MOaPS končí v 3. kvartáli 2026
- Stretnutie v rámci participatívnej prípravy sa uskutočnilo 27.4.2026 – vznesené požiadavky na zmenu nastavenia vybraných parametrov výzvy





Diskusia

Harmonogram plánovaných výziev
vrátane informácie o budúcom
smerovaní projektu „Miestne
občianske a preventívne služby“
a zabezpečení financovania jeho
ďalšej fázy





ÚRAD
SPĽNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Informácia o stave implementácie národných projektov ÚSVRK



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





Národný projekt

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza





Výsledky a stav aktivít v rámci NP MaHIP I.

- ✓ Ročná správa o naplňaní Akčných plánov Stratégie (Monitorovacia správa)

Stav: MS za rok 2023 predložená na rokovanie vlády SR a vzatá na vedomie v septembri 2024, MS za rok 2024 vzatá na vedomie v decembri 2025. Prebieha hodnotenie plnenia aktivít za rok 2025 panelom expertov.

- ✓ Externé hodnotenie naplňania akčných plánov Stratégie 2030 za roky 2022-2024

Stav: hodnotenie prebiehalo od marca 2025, kedy bol zazmluvnený dodávateľ - Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Prebieha tlač publikácie.

- ✓ Stretnutia Tematickej pracovnej skupiny k monitorovaniu a hodnoteniu Stratégie 2030

Stav: a.) stretnutie v januári 2024, b.) online stretnutie v auguste 2024, c.) stretnutie v januári 2025, d.) stretnutie v januári 2026 . Ďalšie stretnutie je plánované na 1. júla 2026.

- ✓ Národná správa o naplňaní Stratégie predkladaná na EK

Stav: správa vznikla v spolupráci s ÚSVRK-SSP-OIP, poslaná EK v júni 2025.

- ✓ Aktualizácia dát Atlasu rómskych komunít - sociografické mapovanie rómskych komunít

Stav: databáza je sfinalizovaná, import dát do informačného mapového portálu na zverejnenie.

- ✓ Informačný mapový portál – online platforma umožňujúca vizualizáciu údajov zo sociografického mapovania rómskych komunít.

Stav: zmluva s dodávateľom (marec 2025), dodanie výstupu v októbri 2025. Zverejnenie portálu.





Výsledky a stav aktivít v rámci NP MaHIP I.

✓ EU SILC_MRK

Stav: Údaje zo ŠÚ SR dodané na konci februára 2026. Prebieha príprava podkladov k správe.

✓ Prieskum verejnej mienky

Stav: výstup dodaný agentúrou FOCUS v decembri 2024, finalizujeme ďalšiu internú analýzu. Predbežný termín publikovania: máj 2026.

✓ Príklady dobrej praxe

Stav: priebežný zber dát v teréne, spracovanie 5 audiovizuálnych výstupov + prebieha príprava ďalších

✓ Dopadové hodnotenie: Aktivita 2.4.5 Spracovanie dopadovej štúdie Dopad účasti na AOTP na zvýšenie zamestnanosti Rómov z pohľadu zamestnávateľov (v AP Zamestnanosť Stratégie 2030).

Stav: od Decembra 2025 prebieha zazmluvňovanie dodávateľa – Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied. Plánovaný termín dodania výstupu: júl 2026.

✓ Analýzy

Analýza prekážok nedostatočného uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k Rómom a Rómkam - publikované v 2025.

Analýza efektívnosti opatrení podporujúcich zamestnateľnosť osôb z MRK v rámci hodnotenia Národného projektu Ľudia a hrady (2022 - 2023) – publikované v 2025.

Analýza rizík viacnásobnej diskriminácie rómskej mládeže – publikované v 2025.

Bariéry detí z MRK v prístupe k programom ranej starostlivosti – predpokladaný termín publikovania: máj 2026

Dostupnosť a bariéry v prístupe MRK k službám zdravotnej starostlivosti poskytovanej ambulantnou a ústavnou formou - zber údajov v teréne.





Iné

- ✓ Názvoslovie obcí – zber údajov od obcí s 15% podielom Rómov týkajúcich sa používania rómskych názvov obcí (spolupráca s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny)

FINANČNÝ STAV NP

- ✓ Celková alokácia v rámci projektu: 3 913 134,99 EUR
- ✓ Zálohové platby: 2 821 945,00 EUR
- ✓ Vyčerpané finančné prostriedky od 09/2023 (začiatok projektu): 1 795 126,77 EUR (ku koncu 01/2026)





ÚRAD
SPLNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Národný projekt Rozvojové tímy – I. fáza



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





ÚRAD
SPĽNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





Informácie o stave implementácie NP RT I.

NP RT I. - pilotný projekt strategického významu (9/2023 - 10/2026) ktorého inovatívnosť spočíva v kombinácii terénnej a komunitnej práce, komplexného integrovaného prístupu s dopadom na celú sídelnú komunitu v 60 zapojených obciach.

Stav implementácie projektu v číslach:

- Implementácia: 09/2023 - 10/2026
- Čerpanie: 31 510 413,90 EUR
- Projekt aktuálne eviduje - 22 120 účastníkov
- Na obsadenie plánovaných 955 pracovných pozícií v RT bolo vyhlásených 1 265 výberových konaní
- Počet zamestnancov RT k 31.03.2026 je 770 (410 Rómov)
- Z celkového počtu zamestnancov sa prvýkrát zamestnalo: 171, z toho 146 žien a 25 mužov



Informácie o stave implementácie NP RT I.

Oblasť vzdelávania - aktivity

- 21 733 mimoškolských aktivít s mládežou (napr. neformálne vzdelávanie, zmysluplné trávenie voľného času)
- 2 526 skupinových preventívnych aktivít zameraných na predchádzanie sociálno-patologickým javom u detí a mládeže
- 45 941 aktivít a individuálnych intervencií zameraných na vedenie klienta ku samostatnosti, podpora a rozvoj rodičovských zručností a rodičovskej zodpovednosti
- 3 035 Mamiklubov (intenzívna práca s rodinou)



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





Informácie o stave implementácie NP RT I.

Oblasť vzdelávania - výsledky

- 2 918 rodín má vďaka podpore RT posilnené rodičovské zručnosti
- 1 451 detí sa podarilo pripraviť na vstup do MŠ/ZŠ
- u 600 detí došlo k zlepšeniu školskej dochádzky
- 2 602 detí sa zúčastňuje aktivít zameraných na neformálne vzdelávanie
- 2 647 mladým ľuďom do 18 rokov bolo poskytnuté poradenstvo zamerané na profesionálnu orientáciu, pričom viac ako 515 mladých vďaka intervenciám RT študuje na SŠ/VŠ
- eliminácia sociálneho vylúčenia - 1 194 aktivít so seniormi
- podpora talentov a zapájanie detí a mládeže do rôznych súťaží
- lepšia pripravenosť detí na vstup do MŠ/ZŠ
- posilnenie spolupráce rodičov so vzdelávacími inštitúciami





Informácie o stave implementácie NP RT I.

Oblasť zamestnanosti - aktivity

- viac ako 11 500 osôb využilo služby RT v oblasti zamestnanosti
- viac ako 23 000 intervencií v oblasti zamestnanosti
- 781 aktivít zameraných na posilňovanie pracovných zručností a uplatnenia sa na trhu práce
- 453 skupinových aktivít a viac ako 13 000 intervencií v oblasti dlhového poradenstva a finančnej gramotnosti poskytnutých zo strany RT
- systematická podpora a konzultačná činnosť v oblasti dlhového poradenstva zo strany konzultantov pre dlhové poradenstvo





Informácie o stave implementácie NP RT I.

Oblasť zamestnanosti - výsledky

- 2 167 osôb zaradených na trh práce na TPP
- 927 osôb získalo pracovné uplatnenie formou dohody
- 257 osôb absolvovalo rekvalifikačný kurz
- zvyšovanie vzdelania externou formou štúdia u mnohých klientov
- zvyšovanie vzdelania a kvalifikácie aj medzi členmi RT – 127 osôb
- odstraňovanie bariéry zamestnanosti prostredníctvom poskytovania dlhového poradenstva – v procese oddlžovania je 2 491 osôb, z toho 354 osôb je už oddlžených



Informácie o stave implementácie NP RT I.

Oblasť bývania - aktivity, výsledky

Zlepšovanie podmienok bývania, zveľad'ovanie obydľí a verejných priestranstiev

- 6 998 komunitných aktivít, 27 397 poskytnutých intervencií, 1 375 aktivít zameraných na zveľad'ovanie verejných priestranstiev, 642 aktivít zameraných na separovanie odpadu
- viac ako 2 300 svojpomocne zveľadených obydľí
- odstránenie viac ako 680 skládok odpadov a posilnenie environmentálneho povedomia obyvateľov
- zlepšenie platobnej disciplíny v prospech obcí pri úhradách nákladov na bývanie
- včasné riešenie takmer 200 krízových situácií (požiare, zosuv pôdy, únik plynu, poškodenie obydľí, zabezpečenie ubytovania pri mimoriadnych situáciách)



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Informácie o stave implementácie NP RT I.

Oblasť boja s protirómskym rasizmom - aktivity, výsledky

Eliminácia protirómskeho rasizmu a posilňovanie sociálnej súdržnosti

- Podpora komunitného dialógu a zlepšenie vzájomných vzťahov v komunitách prostredníctvom zrealizovaných 5 845 senzibilizačných aktivít.
- Participácia na fungovaní komunity: min. 2x ročne Komunitné fórum (zrealizovaných 180 KF), fokusové stretnutia zamerané na prioritné oblasti (305 stretnutí)
- Participácia pri riešení krízových situácií a aktívna účasť na zasadnutí krízových štábov - Bystrany, Richnava, Nálepko, Lemešany
- Príklady dobrej praxe: Ženský klub, Kluby seniorov, Rodičovské kaviarne, Čaj o piatej



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Informácie o stave implementácie NP RT I.

Mikroprojekty a dobrovoľníctvo ako významný prínos NP

Rozvoj obcí a individuálna podpora prostredníctvom mikroprojektov: 599 podaných mikroprojektov, viac ako 200 schválených (získaná suma cez 600 000 EUR)

Príklady dobrej praxe:

- Jasov - požičovňa náradia (podané aj za obec Lascov a Ďurkov)
- Laškovce - pomoc pri zriadení Centra RT + pracovňa
- Sačurov, Rudňany - hygienické centrum + pracovňa
- Vydrník - stojan na pitnú vodu
- Ochtiná, Skrabské - vybudovanie športovísk
- Upracme si Slovensko – 90 % zapojenosť RT
- Individuálna podpora – jednorodičom, rodinám, seniorom, občanom s ŤZP, pomoc pri krízových situáciách, štipendiá pre študentov



Dobrovoľnícke programy: viac ako 1520 zapojených dobrovoľníkov do aktivít RT, na mesačnej báze sa do aktivít RT pravidelne zapája cca 250 dobrovoľníkov



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





Zhodnotenie NP RT I. zo strany zapojených užívateľov

Záujem a pripomienky zo strany užívateľov k pokračovaniu NP - 36 jednoznačný záujem, 24 za určitých podmienok (napr. úprava financovania paušálnej sadzby, zníženie administratívnej záťaže, znema počtu pracovných pozícií, väčšia flexibilita pri nastavovaní tímu)

Vnímanie prínosu pozícií v RT zo strany užívateľov

- najprínosnejšie: sociálny pracovník (60), rozvojový pracovník plánovania (59), rozvojový pracovník pre bývanie (54), rozvojový pracovník pre mládež (52), nene (50)
- menej prínosné: nenementorka, rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo





Prínos NP RT I. z pohľadu zapojených užívateľov

Najvýraznejší dopad	Počet odpovedí	Podiel (%)
Systematická práca s deťmi	54	88,5 %
Sociálna stabilizácia rodín	46	75,4 %
Zníženie dlhov voči obci	43	70,5 %
Lepšia atmosféra v obci	34	55,7 %
Nadobúdanie rodičovských zručností	32	52,5 %
Zefektívnenie separácie triedeného odpadu	30	49,2 %
Zníženie počtu nezamestnaných	24	39,3 %





Optimálny počet členov RT z pohľadu zapojených užívateľov

Optimálny počet zamestnancov RT	Počet odpovedí
do 5 zamestnancov	5
6 – 10 zamestnancov	30
11 – 15 zamestnancov	12
16 – 20 zamestnancov	9
21 – 26 zamestnancov	4





Diskusia

Informácia o stave implementácie národných projektov ÚSVRK





Bod 2

Kritéria pre výber projektov poskytovateľa ÚV SR v rámci priority 4P9 „Dostupné bývanie“





Vecné hodnotiace kritéria

Program Slovensko, Priorita: 4P9 Dostupné bývanie

Poskytovateľ: Úrad vlády SR

- dopytovo – orientované projekty podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
- rovnaké kritériá ako boli použité v rámci Priority 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunit a vzťahovali sa na obce, ktoré neboli zapojené do projektu NP Rozvojové tímy

Dôvod potreby nových kritérií je ich priradenie k novej priorite 4P9 – Dostupné bývanie

Postup schvaľovania:

- pripomienky RO a EK
- pripomienky členov komisie MRK a ich odporúčenie na schválenie MV PSK
- pripomienky členov Monitorovacieho výboru PSK a schválenie procedúrou per rollam





Vyhodnotenie pripomienok – Kritéria pre výber projektov poskytovateľa ÚV SR v rámci priority 4P9 „Dostupné bývanie“

Akceptované pripomienky	4
Čiastočne akceptované pripomienky	1
Neakceptované pripomienky	1





Diskusia

Bod 2

Kritéria pre výber projektov
poskytovateľa ÚV SR v
rámci priority 4P9 –
„Dostupné bývanie“





Návrh uznesenia

UZNESENIE

KOMISIE PRI MONITOROVACOM VÝBORE PRE PROGRAM SLOVENSKO
PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY

č. 1/2026

zo dňa 11.05.2026

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre marginalizované rómske komunity (ďalej len „komisia“)

A odporúča na schválenie Monitorovaciemu výboru pre Program Slovensko

A.1. „Kritéria pre výber projektov poskytovateľa ÚV SR v rámci priority 4P9 – Dostupné bývanie“

B sekretariátu komisie ukladá úlohu

B.1. Zverejniť v spolupráci so sekretariátom Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko prijaté uznesenie na webovom sídle riadiaceho orgánu.

V Bratislave, dňa 11.05.2026

Alexander Daško

predseda Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko
pre marginalizované rómske komunity





ÚRAD
SPLNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Prestávka



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





Bod 3

Prerokovanie zámeru národného projektu „Sprievodné asistenčné služby pre udržateľnosť bývania“





NP Sprievodné asistenčné služby pre udržateľnosť bývania

Priorita: 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít

Špecifický cieľ: ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia

Súvisiace typy akcií: Podpora aktivít v oblasti bývania a ochrany zdravia

Žiadateľ: Dostupný Nájom j.s.a.

Cieľová skupina:

- obyvatelia MRK
- obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK

Alokácia: 3 890 716,31 EUR (COV)

Národný projekt je koncipovaný primárne ako systémová podpora „mäkkých“ aktivít. Finančné prostriedky projektu sú určené výhradne na realizáciu podporných služieb a odborného sprevádzania rodín. **Aktivity priamo nadväzujú na úlohu B.3 Uznesenia vlády č. 371/2023** a sú financované z Programu Slovensko na podporu v oblastiach, ktoré motivujú k pozitívnej zmene v komunite.





NP Sprievodné asistenčné služby pre udržateľnosť bývania

Hlavný cieľ:

pripraviť a podporiť domácnosti z MRK pri vstupe do štandardného nájomného bývania a zabezpečiť udržanie bývania prostredníctvom komplexných „mäkkých“ opatrení, ako sú sociálna práca, finančné poradenstvo, komunitná podpora a rozvoj návykov potrebných pre dlhodobé bývanie. Intervencia je založená na 3D princípoch (desegregácia, degetoizácia a destigmatizácia) a uprednostňuje model mixed housing, teda spoločné bývanie rómskych a nerómskych nájomníkov v rovnakom štandarde.

Realizácia NP zabezpečí:

pre celú cieľovú skupinu MRK zlepšenie kvality života prostredníctvom užívania nájomných bytov. Prispeje najmä k rozvoju samostatnosti a lepšej integrácii do spoločnosti. Zároveň bude zahŕňať aktivity zamerané na sociálnu inklúziu, osvetu a zvýšenie pripravenosti na trh s bývaním, ako aj poskytovanie odbornej asistencie a podpory v oblasti sociálnej mobility.

Hlavná aktivita: Sprievodné asistenčné služby pre udržateľnosť bývania

Podaktivita 1.1: Príprava na nájomné bývanie

Podaktivita 1.2: Udržanie sa v nájomnom bývaní





NP Sprievodné asistenčné služby pre udržateľnosť bývania

Časový rámec trvania projektu: 01/2026 – 12/2030

Merateľné ukazovatele

- **MÚ výstupu:** Počet osôb z MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom realizácie projektu
(indikatívna cieľová hodnota 400 osôb)
- **MÚ výsledku:** Účastníci, ktorí využívajú inkluzívne, sociálne, vzdelávacie, osvetové a podporné služby
(indikatívna cieľová hodnota 800 osôb)
- **MÚ výsledku:** Nové, inovatívne, systémové opatrenia
(indikatívna cieľová hodnota 1)





NP Sprievodné asistenčné služby pre udržateľnosť bývania

Očakávané výsledky NP:

- zabezpečenie čo najvyššieho podielu užívateľov bytov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa, spadajúcich pod oprávnenú cieľovú skupinu (MRK)
- sekundárny prínos pre celú cieľovú skupinu MRK - sociálna inklúzia, osвета a zlepšenie celkovej pripravenosti na trh s bývaním prostredníctvom poskytovania odbornej asistencie a podpory v oblasti sociálnej mobility





Vyhodnotenie pripomienok – NP „Sprievodné asistenčné služby pre udržateľnosť bývania“

Akceptované pripomienky	16
Čiastočne akceptované pripomienky	5
Neakceptované pripomienky	1





Diskusia

Bod 3

Prerokovanie zámeru
národného projektu
„Sprievodné asistenčné služby
pre udržateľnosť bývania“





Návrh uznesenia

UZNESENIE

KOMISIE PRI MONITOROVACOM VÝBORE PRE PROGRAM SLOVENSKO PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY

č. 2/2026

zo dňa 11.05.2026

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre marginalizované rómske komunity (ďalej len „komisia“)

A schvaľuje

A.1. *Zámer národného projektu „Sprievodné asistenčné služby pre udržiateľnosť bývania“ vrátane prijímateľa.*

B sekretariátu komisie ukladá úlohu

B.1. *Zverejniť v spolupráci so sekretariátom Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko prijaté uznesenie na webovom sídle riadiaceho orgánu.*

V Bratislave, dňa 11.05.2026

Alexander Daško

predseda Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko
pre marginalizované rómske komunity





Bod 4

**Prerokovanie zámeru národného projektu
„Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík
zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým
marginalizované rómske komunity – II. fáza“**





Ukotvenie predkladaného projektu

- ✓ Metodický dokument Hodnotenie a monitorovanie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030

NP Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity (2016-2023)

Výstupy – monitorovanie a hodnotenie

- Ročné monitorovacie správy o plnení Stratégie 2020
- Vyhodnotenie indikátorov globálnych a čiastkových cieľov akčných plánov Stratégie 2020
- Externé hodnotenie Stratégie 2020

Výstupy – zber a analýza dát

- EU SILC_MRK 2018, 2020
- Atlas rómskych komunít 2019
- Tematické zisťovania

NP Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza

Výstupy – monitorovanie a hodnotenie

- Ročné monitorovacie správy o plnení Stratégie 2030
- Vyhodnotenie indikátorov globálnych a čiastkových cieľov akčných plánov Stratégie 2030
- Národná správa o plnení Stratégie pre EK
- Externé hodnotenie Stratégie

Výstupy – zber a analýza dát

- EU SILC_MRK 2024/2025
- Atlas rómskych komunít 2025
- Tematické zisťovania/analýzy
- Prieskum verejnej mienky
- Príklady dobrej praxe
- Dopadové hodnotenie – oblasť zamestnanosti
- Informačný mapový portál





Cieľ NP MaHIP - II. fáza

- ✓ Hlavným cieľom je zabezpečiť kontinuálne, metodicky štandardizované monitorovanie a hodnotenie implementácie verejných politík a pokroku v napĺňaní cieľov Stratégie 2030, vrátane zberu dát o životných podmienkach Rómov, predovšetkým MRK.

Špecifickými cieľmi II. fázy projektu sú :

- ✓ zabezpečenie tvorby pravidelných analytických a hodnotiacich výstupov využiteľných pre potreby tvorby, implementácie a revízie verejných politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
- ✓ zabezpečenie pravidelného a časovo porovnateľného zberu údajov o životných podmienkach Rómov a MRK v kľúčových oblastiach (vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie, boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie),
- ✓ rozšírenie existujúcich dátových zdrojov reflektujúce aktuálne socio-ekonomické výzvy a rizikové faktory sociálneho vylúčenia a prepojenie primárne získaných dát s dostupnými administratívnymi zdrojmi s cieľom zvýšiť komplexnosť a výpovednú hodnotu databáz.

Trvanie NP MaHIP – II. fáza

- ✓ 09/2026 – 10/2029 + 2 mesiace
- ✓ Celkovo: 40 mesiacov





Aktivity a výstupy predkladaného projektu: monitorovanie a hodnotenie

- ✓ Ročná monitorovacia správa o napĺňaní Akčných plánov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 – 1x ročne
- ✓ Vyhodnotenie indikátorov globálnych a čiastkových cieľov akčných plánov Stratégie 2030
- ✓ Externé hodnotenie napĺňania cieľov Stratégie – hodnotenie plnenia Akčných plánov Stratégie 2030 za roky 2025-2027 (2028)
- ✓ Dopadové hodnotenia – 4x v rôznych tematických oblastiach Stratégie 2030





Aktivity a výstupy predkladaného projektu: zber a analýza dát

- ✓ EU SILC_MRK - špecializované zisťovanie EU SILC (zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach) v prostredí MRK (2027/2028) + analytická správa z EU SILC_MRK 2024/2025
- ✓ Tematické zisťovania/ analýzy – min. 5 analýz v rôznych tematických oblastiach Stratégie 2030
- ✓ Prieskumy verejnej mienky – 3x kombinácia kvalitatívne a kvantitatívne (spolu 6 správ)
- ✓ Informačný mapový portál – upgrade existujúcej verzie zobrazovania dát o rómskych komunitách/lokalitách
- ✓ Stretnutia tematickej pracovnej skupiny k monitorovaniu a hodnoteniu Stratégie 2030
- ✓ Zber príkladov dobrej praxe – popularizovanie úspešných nástrojov v oblasti inklúzie Rómov so širokou odbornou verejnosťou (5 analýz + workshopy/diseminačné stretnutia)
- ✓ Big Data Analysis – nový prvok – 2x
- ✓ Sociografické mapovanie rómskych komunít 2025 - 1x analytická správa





Finančná alokácia

- ✓ 5 680 737,98 mil. EUR

Personálne obsadenie

- ✓ Počet zamestnancov: 15,5 (11x analytik a regionálny analytik, 2x koordinátor analytikov/aktivít, 1,5x odborný garant aktivít, 1x riaditeľ-analytik)





Vyhodnotenie pripomienok – NP „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – II. fáza“

Akceptované pripomienky	8
Čiastočne akceptované pripomienky	8
Neakceptované pripomienky	3





Diskusia

Bod 4

Prerokovanie zámeru národného projektu
„Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych
politík zameraných na rómsku populáciu,
predovšetkým marginalizované rómske
komunity – II. fáza“





Návrh uznesenia

UZNESENIE

KOMISIE PRI MONITOROVACOM VÝBORE PRE PROGRAM SLOVENSKO PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY

č. 3/2026

zo dňa 11.05.2026

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre marginalizované rómske komunity (ďalej len „komisia“)

A schvaľuje

- A.1. Zamer národného projektu „Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – II. fáza“ vrátane prijímateľa.

B sekretariátu komisie ukladá úlohu

- B.1. Zverejniť v spolupráci so sekretariátom Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko prijaté uznesenie na webovom sídle riadiaceho orgánu.

V Bratislave, dňa 11.05.2026

Alexander Daško

predseda Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko
pre marginalizované rómske komunity





Bod 5

Prerokovanie zámeru národného projektu „Rozvojové tímy II.“





Navrhovaný projektový zámer NP Rozvojové tímy II. fáza

Trvanie projektu: 30 mesiacov (09/2026 - 02/2029)

Miesto realizácie projektu: všetky kraje SR, okrem BSK kraja

Cieľová skupina: obyvatelia MRK a obyvatelia celých sídelných komunít

Predpokladaná alokácia: 33 542 639,22 EUR

Kritéria výberu obcí do NP RT II.: vylučujúce kritériá, hodnotiace kritériá s vysokou, strednou, nízkou váhou, rozlišujúce kritérium





Kritéria výberu obcí do NP RT II.

1. Vylučujúce kritériá:

- prítomnosť rómskych komunít, výstavba KC zo zdrojov EÚ, veľkosť obce

2. Kritéria s vysokou váhou:

- počet obyvateľov, podiel rómskych obyvateľov obce, podiel nevyhovujúcich obydí v osídleniach s MRK

3. Kritéria so strednou váhou

- neštandardný zdroj vody, počet ľudí na jedno obydle, skúsenosti s projektom NP RT I., skúsenosti s implementáciou projektov Programu Slovensko - finančná podpora ESF+, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie, obce v dobiehajúcich regiónoch, overuje sa prítomnosť osídlení s MRK v obci podľa ARK 2025, resp. prítomnosť minimálne 60% rómskych obyvateľov v obciach bez osídlení s MRK

4. Kritéria s nízkou váhou

- obce v území IÚS UMR, obce so zdravotnou a environmentálnou záťažou

5. Rozlišujúce kritérium

- počet obyvateľov osídlení s MRK





Prehľad zmien v kritériách pre výber obcí

Kompletný prehľad 16 kritérií

1.1 Prítomnosť MRK <i>ARK 19 → ARK 2025</i> Aktualizácia ARK	1.2 Výstavba KC <i>3→1 výzva, +ITMS21+</i> Zmena	1.3 Veľkosť obce <i>5000 → 6000 + 250 Rómov</i> Zmena	2.1 Počet obyvateľov <i>Horné pásmo 5000→6000</i> Aktualizácia
2.2 Podiel Rómov <i>Bez zmeny logiky</i> BEZ ZMENY	2.3 Nevyhovujúce obydľia <i>Bez zmeny logiky</i> BEZ ZMENY	3.1 Neštandardný zdroj vody <i>Bez zmeny logiky</i> BEZ ZMENY	3.2 Ľudia na obydľie <i>Bez zmeny logiky</i> BEZ ZMENY
3.3 Skúsenosti s projektami <i>Iba NP RT I. → 5 b</i> Zmena	3.4 Skúsenosti ESF+ (PS) <i>Nové kritérium → 1 b</i> NOVÉ	3.5 PDU <i>12/2025; priemer 4,09 %</i> Aktualizácia	3.6 Dobiehajúce regióny <i>BBSK/KSK/PSK</i> BEZ ZMENY
3.7 Osídlenia s MRK <i>Doplnená podm. 60 % Rómov</i> Aktualizácia	4.1 Územie IÚS UMR <i>Bez zmeny logiky</i> BEZ ZMENY	4.2 Zdrav./env. záťaž <i>Bez zmeny logiky</i> BEZ ZMENY	5.1 Obyvatelia osídlení <i>Rozlišujúce kritérium</i> BEZ ZMENY

SPOLU 16 KRITÉRIÍ: 8 bez zmeny • 4 aktualizované • 3 zmenené • 1 nové





Detail zmien v kritériách výberu obcí: NP RT I. → NP RT II.

1.2 Výstavba komunitného centra

NP RT I.

3 výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2; 2017-2;
OPLZ-PO5a6-2020-1
Udržateľnosť do 31. 12. 2023

NP RT II.

1 výzva: OPLZ-PO5a6-2020-1
Udržateľnosť do 31. 08. 2026
+ rozšírený zdroj dát ITMS21+



Prečo: Reflektuje aktuálny stav projektov KC; obce už zviazané udržateľnosťou v rokoch 2024–2026 boli presunuté medzi neoprávnené.

1.3 Veľkosť obce

NP RT I.

Počet obyvateľov 500 – 5 000

NP RT II.

Počet obyvateľov 500 – 6 000
MINIMÁLNE 250 Rómov v obci



Prečo: Zabezpečuje minimálnu kritickú hodnotu cieľovej skupiny pre efektívny výkon integrovaných intervencií rozvojového tímu.

3.3 Skúsenosti s projektami

NP RT I.

Súhrnné kritérium 4 typov projektov:
TSP I/II • PRIM I/II • MOPS • KC I/II
Maximum: 3 body

NP RT II.

Iba zapojenie do NP RT I.
ÁNO → 5 bodov
NIE → 0 bodov



Prečo: Zásadný posun významu: kontinuita s I. fázou je dvakrát hodnotnejšia než kombinácia 4 starších programov.

3.4 Skúsenosti s projektami ESF+ (PS)

NP RT I.

Kritérium neexistovalo v NP RT I.

NP RT II.

Implementácia projektu z dopytovej výzvy
ESF+ v PO 2021–2027 (napr. MOPS /
MOaPS)
ÁNO → 1 bod • NIE → 0 bodov



Prečo: Doplnková motivácia pre obce, ktoré preukázali absorpčnú a administratívnu kapacitu v aktuálnom programovom období.





Ciele NP RT II.

Hlavný cieľ NP: Prehĺbiť a rozšíriť implementáciu integrovaného komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s cieľom zlepšiť životné podmienky, podporiť sociálno-ekonomickú integráciu a znížiť mieru segregácie a diskriminácie.

Špecifické ciele:

1. Pokračovať v podpore rovného prístupu, najmä príslušníkov MRK, ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde od raného detstva až po uplatnenie na trhu práce, s dôrazom na systematické uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení na všetkých stupňoch vzdelávania.
2. Zintenzívniť opatrenia zamerané na znižovanie nerovností v oblasti bývania medzi MRK a väčšinovým obyvateľstvom, vrátane podpory legálneho bývania, zlepšenia technickej infraštruktúry a pokračovania v odstraňovaní pretrvávajúcej segregácie.
3. Zvýšiť zamestnanosť a posilniť uplatnenie na trhu práce prostredníctvom individuálnej podpory, rozvoja pracovných zručností, profesijnej orientácie a uľahčenia vstupu na trh práce.
4. Realizovať opatrenia zamerané na elimináciu protirómskeho rasizmu, podporu nediskriminácie, posilnenie participácie marginalizovaných rómskych komunít a ochranu najzraniteľnejších skupín, s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť a systémový dopad intervencií.





Aktivity NP RT II.

Hlavná aktivita projektu:

Zlepšenie životných podmienok s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov zapojených obcí.

Podaktivity projektu:

1. Výkon rozvojových tímov
2. Profesionálny a osobnostný rozvoj členov rozvojových tímov
3. Komplexná metodická podpora a odborné konzultácie členom rozvojových tímov

Výkon rozvojových tímov bude postavený na multidisciplinárnom prístupe, zabezpečený v **60 obciach** v kľúčových oblastiach **vzdelávania, zamestnanosti, bývania a boja s protirómskym rasizmom vrátane podpory participácie**, pričom konkrétne aktivity v jednotlivých oblastiach vychádzajú z mapovania potrieb identifikovaných v teréne a zo skúseností implementácie prvej fázy projektu.



Navrhované inovatívne prvky v rámci projektového zámeru

Oblasť vzdelávania: vznik materských centier, systematická prevencia sociálno-patologických javov s dôrazom na prevenciu závislostí, dôraz na aktivity zamerané na finančnú gramotnosť, podpora aktívneho starnutia u seniorov a medzigeneračné učenie

Oblasť bývania: riešenie energetickej chudoby (zvyšovanie energetickej gramotnosti, podpora efektívneho hospodárenia s energiami a poskytovanie praktických úsporných riešení), cyklus preventívnych vzdelávacích aktivít zameraných na ochranu pred požiarimi, na posilnenie zodpovednosti pri nakladaní s odpadom a na zlepšenie orientácie v oblasti bývania



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





Navrhované inovatívne prvky v rámci projektového zámeru

Oblasť zamestnanosti: podpora vzniku udržateľných foriem zamestnávania na miestnej úrovni – identifikácia potenciálu pre vznik sociálnych podnikov v zapojených obciach, analýza príležitostí a oblastí podnikania, asistencia pri založení a nastavení fungovania v počiatočnej fáze prevádzky, oddlžovanie klientov – intenzívne dlhové poradenstvo previazané na oblasť zamestnanosti


Boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie: rovesnícky program (peer to peer) - podpora mladých rómskych lídrov, aktivizácia rómskych mladých dievčat a žien – programy zamerané na zlepšenie postavenia rómskych žien v spoločnosti, dôraz na mikroprojekty a dobrovoľnícke programy





Navrhované klúčovanie a pozície v NP RT II.

Počet obyvateľov	Klúčovanie pozícií	RPP	SP	RPB	RPM	Nene	Asistent	Voliteľná pozícia
do 1000	5	1	1	1	1	1	0	0
do 2000 (podiel MRK pod 50 %)	5	1	1	1	1	1	0	0
do 2000 (podiel MRK nad 50,01 %)	6	1	1	1	1	2	0	0
do 3000 (podiel MRK pod 50 %)	8	1	2	1	1	2	1	0
do 3000 (podiel MRK nad 50,01 %)	9	1	2	1	1	2	1	1
do 4000 (podiel MRK pod 50 %)	10	1	2	2	2	2	1	0
do 4000 (podiel MRK nad 50,01 %)	11	1	2	2	2	2	1	1
nad 4000 (podiel MRK pod 50 %)	13	1	3	2	2	4	1	0
nad 4000 (podiel MRK nad 50,01 %)	15	1	3	2	2	4	1	2





Interný tím v NP RT II.

- Projektový manažér
- Hlavný finančný manažér - kontrolór
- Manažér pre viditeľnosť, transparentnosť a komunikáciu
- Manažér pre monitorovanie a hodnotenie
- Finanční manažéri
- Odborní garanti aktivít
- Koordinátor aktivít
- Regionálni koordinátori
- Konzultanti: nenementorky, konzultanti pre dlhové poradenstvo, konzultanti pre oblasť bývania a protirómskeho rasizmu, konzultanti pre oblasť vzdelávania a zamestnanosti
- Supervízori pre členov RT





Vyhodnotenie pripomienok – NP „Rozvojové tímy II.“

Akceptované pripomienky	18
Čiastočne akceptované pripomienky	4
Neakceptované pripomienky	1





Diskusia

Bod 5

Prerokovanie zámeru
národného projektu
„Rozvojové tímy II.“





Návrh uznesenia

UZNESENIE

KOMISIE PRI MONITOROVACOM VÝBORE PRE PROGRAM SLOVENSKO PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY

č. 4/2026

zo dňa 11.05.2026

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre marginalizované rómske komunity (ďalej len „komisia“)

A schvaľuje

A.1. Zámer národného projektu „*Rozvojové tímy II.*“ vrátane prijímateľa.

B sekretariátu komisie ukladá úlohu

B.1. Zverejniť v spolupráci so sekretariátom Monitorovacieho výboru pre Program Slovensko prijaté uznesenie na webovom sídle riadiaceho orgánu.

V Bratislave, dňa 11.05.2026

Alexander Daško

predseda Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko
pre marginalizované rómske komunity





ÚRAD
SPĽNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Prestávka na obed



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





Bod 6 Rôzne

Prezentácia projektu technickej pomoci ako projektu, ktorého celkové náklady presahujú 10 mil. EUR

Informácia o stave informovanosti za ÚV SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko

Hodnotenie implementácie rozpočtu Programu Slovensko na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít

Správa o stave plnenia investičných plánov čerpania k 31.12.2025

Informácia o súťaži REGIOSTARS

Stratégia EÚ pre boj proti chudobe





Prezentácia projektu technickej pomoci ako projektu, ktorého celkové náklady presahujú 10 mil. EUR





Základné informácie o projekte, ktorého celkové náklady presahujú 10 mil. EUR

Alokácia TP pre prijímateľa ÚV SR (do 2028) - 25 308 844 EUR

1. Výzva MIRRI SR pre ÚV SR (2023-2024): 7 430 676,64 EUR

5 ŽoNFP / projektov TP : cca 5,098 mil. EUR

Čerpanie: 14 ŽoP: cca 4,997 mil. EUR

2. Výzva MIRRI SR pre ÚV SR (2025-2026): 12 791 549,87 EUR

1 ŽoNFP / projekt TP: „Financovanie výdavkov ÚV SR – ÚSVRK ako SO pre P SK na roky 2025 -2026“

Číslo projektu v ITMS21+: 401703F447

Výška schváleného NFP: **12 556 186,14 EUR** Obdobie realizácie: 1/25 – 12/26

podľa v čl. 50 NSU č. 2021/1060 → projekt nad 10 mil. EUR → projekt strategického významu

Hlavný cieľ projektu:

Zabezpečiť dostatočné, stabilné a odborne kvalifikované AK potrebné na riadenie, implementáciu a kontrolu fondov EÚ v rámci PSK

Hlavná aktivita projektu:

Financovanie oprávnených mzdových výdavkov AK ÚV SR – ÚSVRK ako SO pre P SK v rokoch 2025-2026





Prezentácia projektu TP - Projektu, ktorého celkové náklady presahujú 10 mil. EUR

„Dostatok kvalitných administratívnych kapacít ako základ implementácie fondov EÚ“

Priamy vplyv na:

- čerpanie finančných prostriedkov
- kvalitu projektov a kontrol
- prevenciu nezrovnalostí a chýb

Stabilné a kvalifikované AK:

- znižujú fluktuáciu
- zvyšujú efektivitu procesov
- zabezpečujú kontinuitu riadenia

EK zdôrazňuje:

- Potrebu efektívneho využívania zdrojov
- Zvyšovanie čerpania a predchádzanie dekomitmentu

BEZ dostatočného počtu kvalitných AK nie je možné zabezpečiť úspešnú implementáciu programového obdobia.



Závery zasadnutia Komisie pri MV pre PSK pre budovanie AK

Riziká a výzvy zabezpečenia implementácie po roku 2028:

- Nedostatok finančných zdrojov na AK po roku 2028
- Rast objemu implementácie, vysoké pracovné tempo, časový tlak na plnenie míľnikov = rast nárokov na AK
- Obmedzené možnosti úspor v systéme
- Riziká:
 - Poklesu kvality výstupov, zvýšenie ich chybovosti
 - Spomalenie implementácie a nesplnenie míľnikov
 - Konkurencia – „preťahovanie“ kvalifikovaných AK – odchod kľúčových odborníkov a vyššie náklady na zaškolenie nových

BEZ systémového riešenia financovania AK je ohrozená implementácia po roku 2028 a príprava nového PO.

Kľúčové opatrenia pre udržateľnosť kvalitných AK:

- Zabezpečenie dostatočných zdrojov financovania AK aj po roku 2028 – motivácia AK k dosahovaniu cieľov, zvyšovaniu výkonnosti a kvality práce a znižovaniu fluktuácie a rizika vyhorenia
- Systematické vzdelávanie a profesionalizácia – neustále meniaci sa legislatívny a procedurálny rámec v oblasti implementácie fondov EU
- Interná mobilita a rotácia AK



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO




ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





Vývoj počtu pridelených a obsadených AK (v FTE)

UV č. 488/2023 k stanoveniu počtu AK financovaných z TP fondov EU v PO 2021-2027 a nastaveniu systému financovania AK spolu s Rozhodnutiami ministra MIRRI o schválení počtu AK potrebných pre implementáciu fondov EÚ zdefinovali pre ÚV SR nasledovné počty AK v FTE:

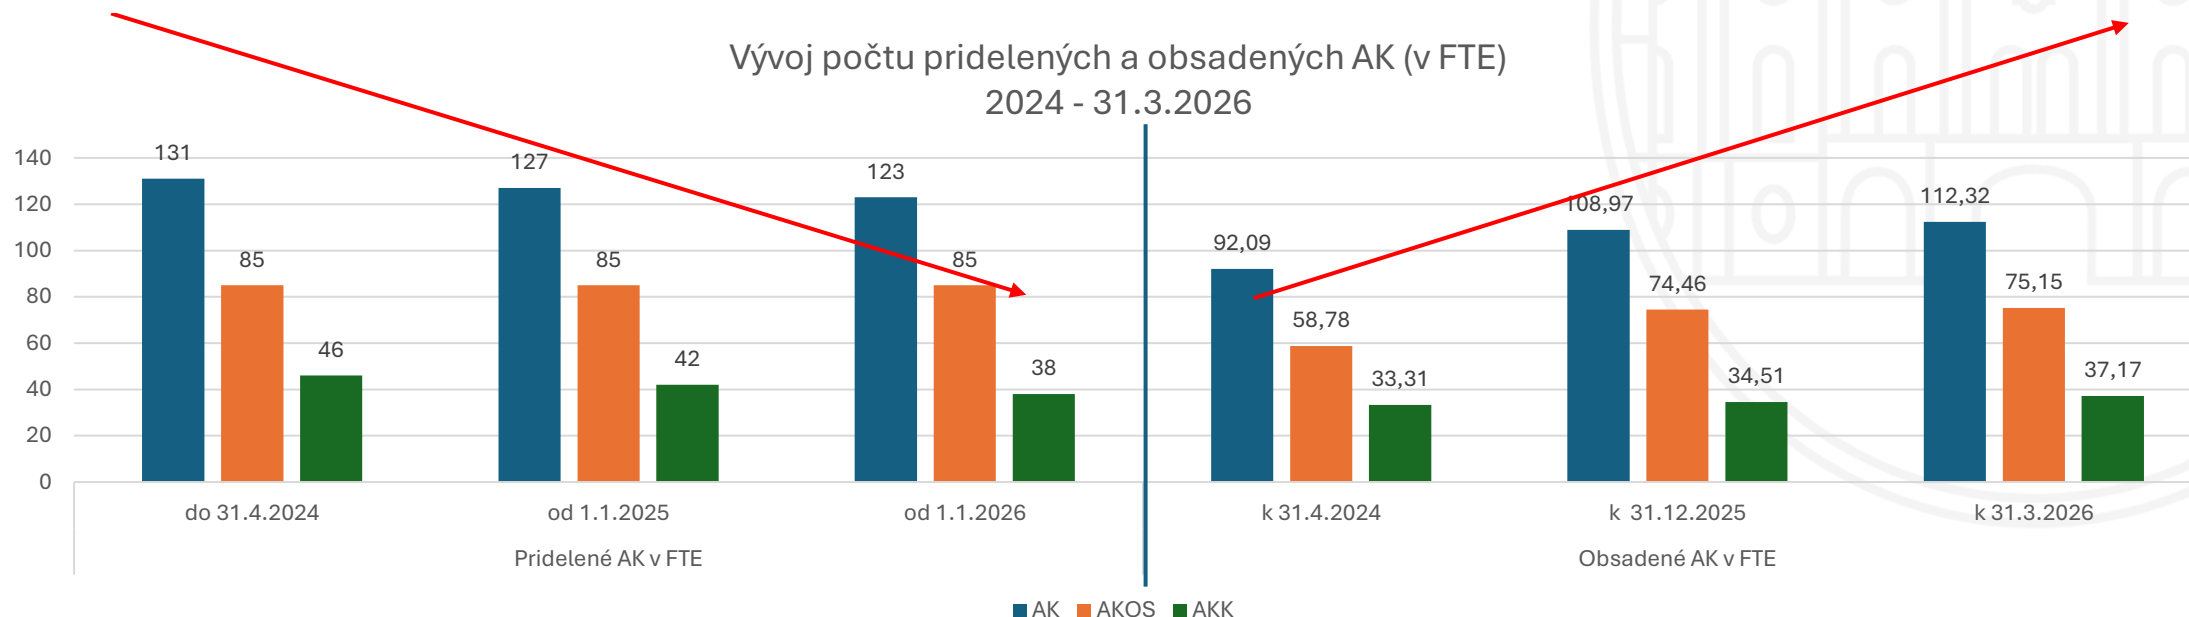



Finančné vyjadrenie čerpania a Merateľné ukazovatele projektu

k 31.3.2026: **4 ŽoP (1/25-3/26) predložené – 5 797 311,78 EUR**

3 ŽoP (2025) uhradené zo strany MIRRI SR – 4 738 192,55 EUR

➤ MU: Priemerný ročný počet **AKOS** financovaných z projektu TP:

- Cieľová hodnota k 31.12.2026:
- k 31.12.2025:
- k 31.03.2026 za 1Q2026:

77 FTE

74,46 FTE (96,7% cieľovej hodnoty)

75,15 FTE

➤ MU: Počet uzatvorených **dohôd** o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru :

- Cieľová hodnota k 31.12.2026:
- K 31.12.2025:
- k 15.3.2026:

66 dohôd

36 dohôd

28 dohôd (Celkom: 64 dohôd t.j. 96,97% cieľovej hodnoty)

Celkový priemerný ročný počet AK v FTE:

- v roku 2024: **92,09 FTE** (obsadených v priemere 94,42 AK)
- v roku 2025: **108,97 FTE** (obsadených v priemere 115,42 AK)
- k 31.3.2026: **112,32 FTE** (obsadených v priemere 118 AK)





Priebežné zhodnotenie realizácie projektu TP

V rámci ostatných výdavkov projektu (14,77%) sú / budú financované výdavky, zadefinované vo výzve a riadiacej dokumentácii napr.:

- Mzdové výdavky zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti pre ÚV SR – ÚSVRK ako SO pre PSK v max. 5% z počtu AK
- Výdavky vynaložené na materiálo-technické vybavenie pre oprávnené AK SO a výdavky spojené s jeho prevádzkou a užívaním za účelom kvalitnejšieho a efektívnejšieho plnenia pracovných činností AK v rámci implementácie PSK
- Výdavky vynaložené na aktivity špecifického vzdelávania oprávnených AK realizovaných mimo CPV AK fondov EÚ
- Výdavky vynaložené na organizáciu zasadnutí Komisie pri MV PSK pre MRK
- Výdavky vynaložené na aktivity zabezpečujúce hodnotenie, informovanie a viditeľnosť o pomoci EÚ
- Výdavky na zabezpečenie ZPC a TPC oprávnených AK

ZHODNOTENIE:

- Projekt je realizovaný v súlade s plánovaným harmonogramom a rešpektuje horizontálne princípy EÚ
- Projekt priebežne naplňa stanovené cieľové hodnoty MU
- Projekt prispieva k efektívnemu fungovaniu ÚV SR - ÚSVRK ako SO pre P SK
- Prispieva k stabilizácii zamestnancov zapojených do implementácie fondov EÚ a znižovaniu fluktuácie administratívnych kapacít
- Prispieva k zlepšeniu efektivity procesov riadenia, monitorovania, kontroly a hodnotenia projektov PSK





Informácia o stave informovanosti za ÚV SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko





Komunikácia projektov financovaných z fondov EÚ – Program Slovensko

formou vydávania tlačových správ

na sociálnych sieťach

prostredníctvom webu ÚSVRK

priama komunikácia s médiami





Externá komunikácia ÚSVRK prostredníctvom web stránky www.romovia.vlada.gov.sk



Pravidelná aktualizácia výziev a základných informácií k projektom

Do rubriky aktuality zaraďujeme aj výstupy z projektov

V novozriadenej videosekcii prinášame informácie o realizácii projektov

Všetky videá zverejňujeme aj na youtube





ÚRAD
SPĽNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Prezentácia projektov



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO




ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





ÚRAD
SPLNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Aktivita rozvojového tímu



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





ÚRAD
SPLNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY



V Šarišskej Porube chcú mať okolo domov čisto.
Vedú k tomu aj svoje deti



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





Externá komunikácia ÚSVRK – sociálne siete v roku 2025



Facebook

12,5 milióna
pozretí
za rok 2025 a vysoký
nárast sledovanosti videí



Instagram

na Instagrame máme
inú skupinu sledujúcich
a denný priemer je
okolo 90 pozretí



LinkedIn

LinkedIn je profesionálna
platforma kde sme
sledovaní skôr odbornou
verejnosťou s denným
priemerom okolo 50
pozretí



YouTube

Všetky videá zdieľame, na
YouTube pričom link
zverejňujeme aj v novej
sekcii na našom webe



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





Komunikácia s médiami

Počet vydaných tlačových správ
k 1. 5. 2026

41

Počet odpovedí novinárom za
rok 2025

162





Diskusia

Informácia o stave
informovanosti za ÚV SR
ako sprostredkovateľského
orgánu pre Program
Slovensko





Hodnotenie implementácie rozpočtu Programu Slovensko na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít





Hodnotenie implementácie rozpočtu Programu Slovensko na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít

5. 3. 2026

Účinnosť
zmluvy

Deň 0

7. 4. 2026

Návrh
Úvodnej správy

20.04 2026

Schválenie
Úvodnej správy

Deň ~45

júl-aug 2026

Návrh Záverečnej
správy

1. 9. 2026

Finálne dodanie
diela

Deň 180

Objednávateľ: Úrad vlády SR

Zhotoviteľ: Octigon a.s.

Predmetom zmluvy je vykonanie externého hodnotenia implementácie rozpočtu Programu Slovensko (P SK) na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Hodnotenie je vykonávané na alokácii z P SK vyčlenenej na podporu inklúzie MRK v celom rozsahu, t. j. 907 mil. EUR v rámci pôsobnosti štyroch sprostredkovateľských orgánov: ÚV SR – ÚSVRK, MPSVaR SR, MŠVVaM SR a MZ SR

Dňa 20.04.2026 bola odovzdaná Úvodná sprava v zmysle Zmluvy č. 38/2026 <https://www.crz.gov.sk/zmluva/12062116/>





Hodnotenie implementácie rozpočtu Programu Slovensko na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít

Harmonogram prác v zmysle Úvodnej správy

Aktivita	03	04	05	06	07	08
Úvodné stretnutie k hodnoteniu (12.03.2025)						
Analýza dostupných údajov a informácií						
Definovanie prístupu k hodnoteniu a výber metód						
Spracovanie návrhu úvodnej správy						
Desk-research						
Osobné pohovory so zástupcami S0						
Analýza výziev a projektov						
Príprava a realizácia osobných pohovorov s prijímateľmi						
Analýza kompetencií a kapacít ÚSVRK						
Spracovanie prípadových štúdií						
Spracovanie predbežných záverov a odporúčaní						
Validačné stretnutie						
Spracovanie návrhu záverečnej správy						
Spracovanie konečnej verzie záverečnej správy						
Riadenie, komunikácia a kontrola kvality						





Diskusia

Hodnotenie implementácie
rozpočtu Programu Slovensko
na podporu inklúzie
marginalizovaných rómskych
komunít





ÚRAD
SPLNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Správa o stave plnenia investičných plánov čerpania k 31.12.2025



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Informácia k správe o stave plnenia investičných plánov čerpania k 31. 12. 2025

- investičný plán tvorí prílohu č. 1 zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (SO) a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením;
- investičný plán obsahuje okrem iného limity kontrahovania (zazmluvnenia) a čerpania alokácie Programu Slovensko v gescii SO;
- plnenie záväzkov čerpania sa sleduje k 31. decembru 2025;
- **vyhodnotenie plnenia investičných plánov čerpania je v zmysle aktuálne platných zmlúv o poverení a Manuálu procedúr RO pre P SK v.4;**
- v nadväznosti na **schválenie revízie Programu Slovensko** (verzia 4.1), ktorá bola schválená vykonávacím rozhodnutím komisie zo dňa **18. marca 2026 budú upravené nové alokácie v investičných plánoch sprostredkovateľských orgánov, kde budú zohľadnené nové finančné plány.**

Plnenie investičných plánov čerpania k 31. decembru 2025 podľa rezortov

Rezort	Alokácia EÚ zdroj v EUR	Plán čerpania EÚ zdroj v EUR	Čerpanie	
			EÚ zdroj v EUR	% z plánu čerpania
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR	1 021 277 277	142 788 831	231 323 736	162,00%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	1 812 615 613	281 124 041	409 282 326	145,59%
Úrad vlády SR	431 500 000	54 978 441	72 080 293	131,11%
Ministerstvo vnútra SR	98 722 821	13 753 475	15 908 049	115,67%
Ministerstvo dopravy SR	3 384 282 748	448 377 365	476 577 107	106,29%
Slovenská inovačná a energetická agentúra	896 271 945	111 826 583	106 602 873	95,33%
Ministerstvo hospodárstva SR	572 825 210	67 373 308	63 953 962	94,92%
Ministerstvo životného prostredia SR	1 576 863 107	215 576 152	129 722 353	60,17%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	2 432 893 790	303 655 081	96 303 420	31,71%
Ministerstvo zdravotníctva SR	366 482 422	49 460 939	10 231 792	20,69%
SPOLU Program Slovensko	12 593 734 933	1 688 914 216	1 611 985 910	95,45%

Plnenie investičných plánov čerpania k 31. decembru 2025 podľa implementačných sekcií MIRRI SR

Implementačné sekcie riadiaceho orgánu MIRRI SR	Alokácia EÚ zdroj v EUR	Plán čerpania EÚ zdroj v EUR	Čerpanie	
			EÚ zdroj v EUR	% z plánu čerpania
Sekcia programovania a podpory Programu Slovensko	410 233 301	50 730 970	76 967 417	151,72%
Sekcia regionálneho rozvoja	226 693 618	6 748 867	950 197	14,08%
Sekcia implementácie Programu Slovensko	1 304 388 368	172 543 161	13 549 748	7,85%
Sekcia implementácie projektov informatizácie	491 578 503	73 632 083	4 836 309	6,57%
SPOLU MIRRI SR	2 432 893 790	303 655 081	96 303 671	31,71%



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sumár najčastejších dôvodov neplnenia investičného plánu čerpania

- oneskorené vyhlasovanie výziev (neplnenie harmonogramu plánovaných výziev) a zdĺhavý hodnotiaci proces;
- podpriemerné kontrahovanie;
- zdĺhavé a opakované verejné obstarávania, kontrola verejného obstarávania ;
- pomalší nábeh implementácie projektov IÚI/UMR;
- nerovnomerné čerpanie v rámci rôznych opatrení;
- čiastočné obmedzenie vyhlasovania výziev v roku 2025 v súvislosti s revíziou do MPS;
- dlhý časový cyklus prípravy IT projektov;
- paralelná implementácia Plánu obnovy a odolnosti.



Diskusia

Správa o stave
plnenia investičných
plánov čerpania
k 31.12.2025





ÚRAD
SPĽNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Informácia o súťaži REGIOSTARS



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



REGIOSTAR

S competition for Cohesion Policy Projects

DG REGIO.F4



The Europe-wide search for the best **REGIOSTARS** projects of 2026 is now open!

- Organised annually since 2008
- **5 categories** aligned to Policy objectives (2021-2027)
- The project has received EU co-financing from **the ERDF, CF, ESF, JTF, INTERREG**, starting earliest on 1 January 2014.
- Only **completed projects** are considered.
- Award criteria: Cohesion, Impact, Innovation, Sustainability, Citizens, Transferability
- Applications must be in an official EU language.
- The application includes an endorsement letter of the Managing Authority.
- Application submitted via the online platform **by 22 May 2026**

REGIOSTARS 2026 timeline

Phase 1: Application & Finalist Selection

February 10 Competition Launch

The official start for projects to submit their entries for consideration.



July 14 Finalists Announced

Successful projects are revealed following the official eligibility check.



May 22 Application Deadline

The final date for all project submissions to be completed.



Phase 2: Voting, Pitching & Winners

October 13-14 (tbc) The Grand Finale

Finalists pitch to jurors before the official REGIOSTARS Ceremony takes place.



September 3 Public Voting Opens


The community begins voting for their favorite regional projects online.



November 1 Winner Campaigns

Local promotional campaigns begin to celebrate and showcase the winning projects.

REGIOSTARS 2025: applications – country overviews

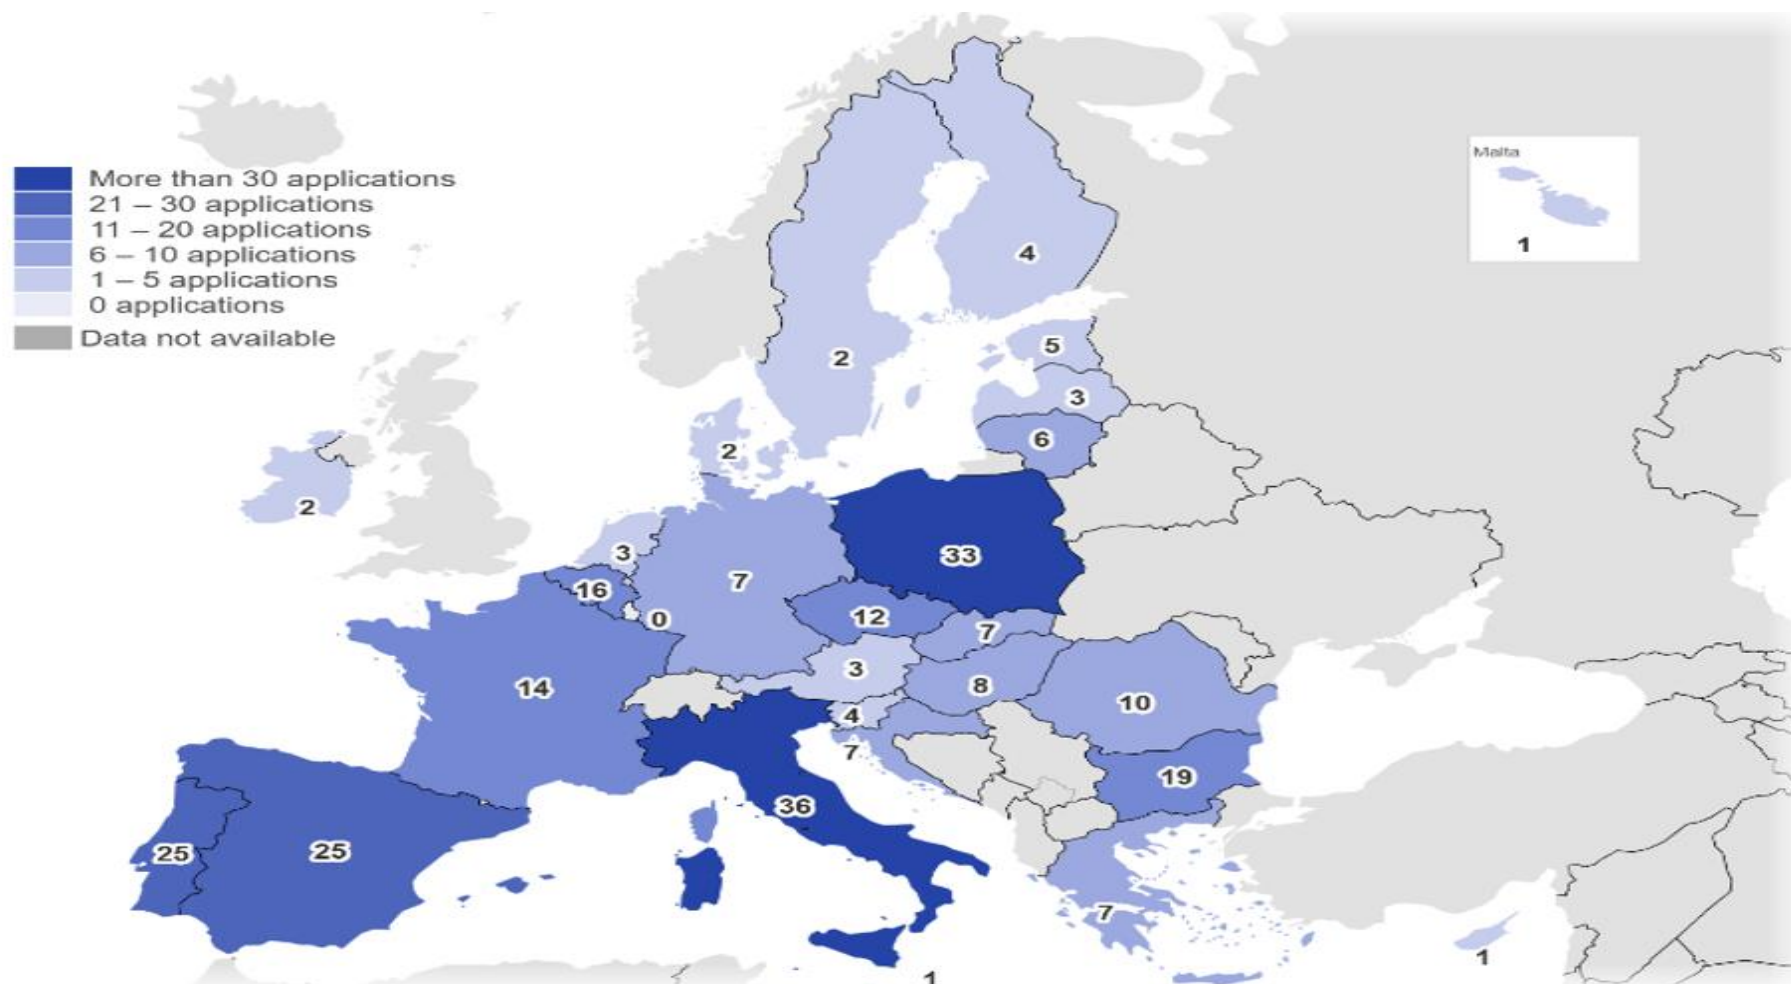

REGIOSTARS 2025 Winners



**Satellite radar-
based
fertilisation
maps**

Poland



**AGEO -
Atlantic
Geohazard
Risk
Management**

Portugal, Spain,
France, Ireland,
United Kingdom



**MONOCAB OWL
- New mobility
on old tracks**

Germany



**Early support
for families at
risk**

Czechia



**Shankill
Shared
Women's
Centre**

United Kingdom,
Ireland



Important links

- **REGIOSTARS website:** https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/region-stars-awards_en
 - Information about the competition
 - All materials available: Guide for applicants, application form, endorsement letter, frequently asked questions, visuals
- **Application form:** <https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/REGIOSTARS2026>
- **Communication kit/visuals:** [to be downloaded here](#)
- Example of a winning project: [Czech Republic: Pioneering postnatal support project for families at psychosocial risk wins award](#)
- **Contact:** REGIO-REGIOSTARS@ec.europa.eu



ÚRAD
SPĽNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Stratégia EÚ pre boj proti chudobe



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY




Strategie EU pro boj proti chudobě

Autor: Lukáš Pachta

*"Chudoba je nejhorší formou
násilí."*

— Mahátma Gándhí



Historický milník: 6. května 2026

První evropská strategie v historii

Po měsících příprav byla v Bruselu přijata historicky vůbec první Strategie EU pro boj proti chudobě. Tato strategie nastavuje komplexní rámec pro ochranu 93 milionů Evropanů v riziku chudoby.

 Hlavní garant: Evropská komise

 Datum přijetí: 6. května 2026

 Vize: Vymýcení chudoby do roku 2050

– po
konzultaci
– SWDs a návrh
doporučení
Rady (bydlení)



Tři hlavní pilíře strategie



1. Záruka pro děti

Opatření k zajištění bezplatného přístupu ke vzdělání, stravě a péči pro každé ohrožené dítě v EU.



2. Bydlení pro všechny

Nová doporučení pro boj proti sociálnímu vyloučení z bydlení a bezdomovectví v členských státech.



3. Práva osob s OZP

Zásadní návrhy na zlepšení integrace a životních podmínek osob se zdravotním postižením.

Evropská záruka pro děti

Cílem je prolomit cyklus znevýhodnění od útlého věku. Strategie zajistí 19,3 milionu ohrožených dětí efektivní přístup k:

- Kvalitnímu vzdělávání a péči v raném věku
- Zdravému stravování (minimálně 1 teplé jídlo denně)
- Pravidelné zdravotní péči
- Adekvátnímu a bezpečnému bydlení



Boj proti vyloučení z bydlení



Model "Housing First"

Bydlení je prerekvizitou pro důstojný život. Strategie zavádí doporučení pro boj s bezdomovectvím prostřednictvím personálně orientovaných politik.

- Zvýšení dostupnosti sociálního bydlení
- Prevence nuceného vystěhování
- Podpora zranitelných rodin s vysokými náklady na energie

Práva osob s postižením (OZP)

29%

OSOB S OZP V RIZIKU CHUDOBY

Inkluze a rovné příležitosti

Strategie navrhuje zásadní kroky ke zlepšení práv a integrace OZP na trh práce i do společnosti:

- Balíček zaměstnanosti pro osoby s postižením
- Posílení Evropského průkazu OZP
- Podpora nezávislého života a deinstitucionalizace

Opatření a implementace



Financování

Mobilizace fondů ESF+, RRF a Sociálního klimatického fondu pro sociální cíle.



Partnerství

Nová Koalice proti chudobě propojující soukromý sektor a filantropii s orgány veřejné moci.



Koordinace

Ustanovení Národních koordinátorů pro boj proti chudobě v každém členském státě.



Call

ESF-SI-2026-ROMA NEETs-01

Published: **May 6, 2026**

Closing: **30 September 2026 17:00:00 CEST**

**Strand II 'Supporting
access to the labour
market of Roma NEETs'**

<https://socialinnovationplus.eu/call/strengthening-the-european-child-guarantee-national-governance-systems-and-supporting-access-to-the-labour-market-for-roma-neets-2/>

The European Commission and the European Competence Centre for Social Innovation launched a new transnational Call: **‘Strengthening the European Child Guarantee national governance systems and supporting access to the labour market for Roma NEETs’** under the European Social Fund+ Social Innovation+ initiative.

Under the Strand II “Supporting access to the labour market of Roma NEETs”, the Call will aim to support transnational social experimentation projects which test innovative approaches to improve Roma NEETs’ access to employment through tailored activation strategies.

Applicants are encouraged to propose activities best suited to their specific context, however **the following key activities shall be covered in each proposal:**

1. **Mapping of the specific problems and challenges faced by Roma NEETs.** Activities include the identification of the target groups as well as the problems and challenges that those groups face, and which prevent them from being in employment.
2. **Designing a tailored job pathway support and activation model for Roma NEETs through strengthened stakeholder collaboration.** For example, activities may include engaging and bringing together key stakeholders relevant to Roma NEETs, such as organisations representing Roma, NGOs, and Public Employment Services. Involving young Roma in designing solutions would be a key element.
3. **Reaching out and matching.** Activities should include matching Roma NEETs with concrete job opportunities or raising awareness about areas in which Roma NEETs could be self-employed.
4. **Activities supporting employment or self-employment of the target group.** Such activities could include, for instance, organisational incentives to hire Roma NEETs and retain them in employment for at least six months (i.e., financial support in the form of wage subsidies, or non-financial support in the form of coaching, mentoring, mediation with employers). Self-employment support could involve mentoring and counselling to encourage self-employment, including advice on access to finance.
5. **Activities related to skilling.** Such activities can include delivering training relevant to the job, or on-the-job training, work experience, etc., or skills for managing a microenterprise with the aim of supporting sustainable employment.
6. **Selecting an effective method for scaling-up the social experimentation tested through the project and defining a scaling-up strategy.** This includes preparing an actionable strategy on the replication, expansion, or integration of the selected method into the activities of PES, and on how to involve relevant public authorities.
7. **Monitoring and evaluation systems.** Activities should include surveys of beneficiaries of matching and employment programmes, or of those who benefit from support for self-employment, for the monitoring and evaluation of outcomes, and identifying efficient ways for data collection and data sharing.
8. **Raising awareness.** Activities should include organising events and dissemination actions to promote approaches to the labour activation of Roma NEETs (employment or self-employment).
9. **Participation in mutual learning events organised by the European Competence Centre for Social Innovation.**



Bod 7

Záver





ÚRAD
SPLNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Ďakujeme Vám za účasť a spoluprácu



Spolufinancovaný
Európskou úniou



PROGRAM
SLOVENSKO



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

